



Programas y Proyectos de Rehabilitación de Redes Eléctricas – BEI/OFID
Informe de Seguimiento de los Programas y Proyectos.

Octubre 2023


Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de Redes



A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de Octubre 2023 correspondiente a la Licitación Pública Internacional No.LPI-BEI-01-2012 del Banco Europeo de Inversiones.


Avance del Total Financiamiento

La grafica muestra el avance de las actividades previa para las 79,719 normalizaciones programadas a ejecutarse al finalizar los proyectos.

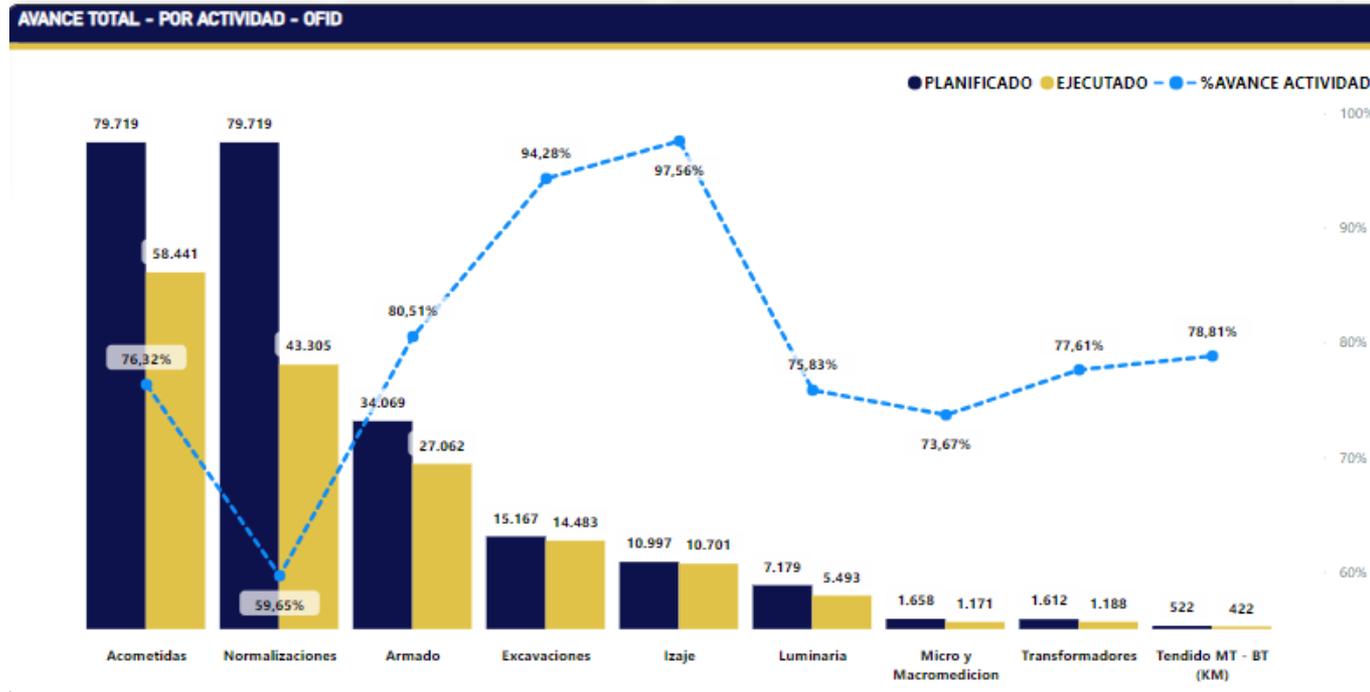


Avance del Proyecto Circuito CALE02

La grafica muestra el avance de las actividades previa para las 10,730 normalizaciones programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto.

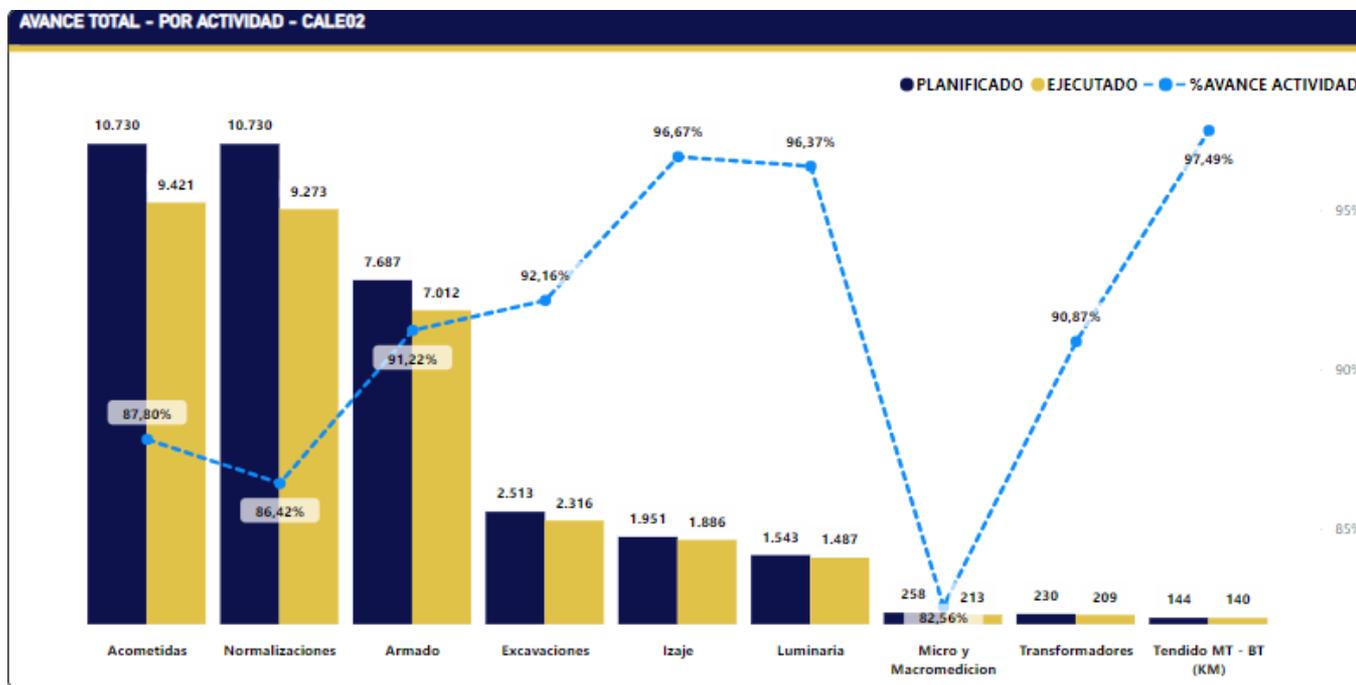


Avance del Proyecto Circuito GU6901

La grafica muestra el avance de las actividades previa para las 9,278 normalizaciones programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto.

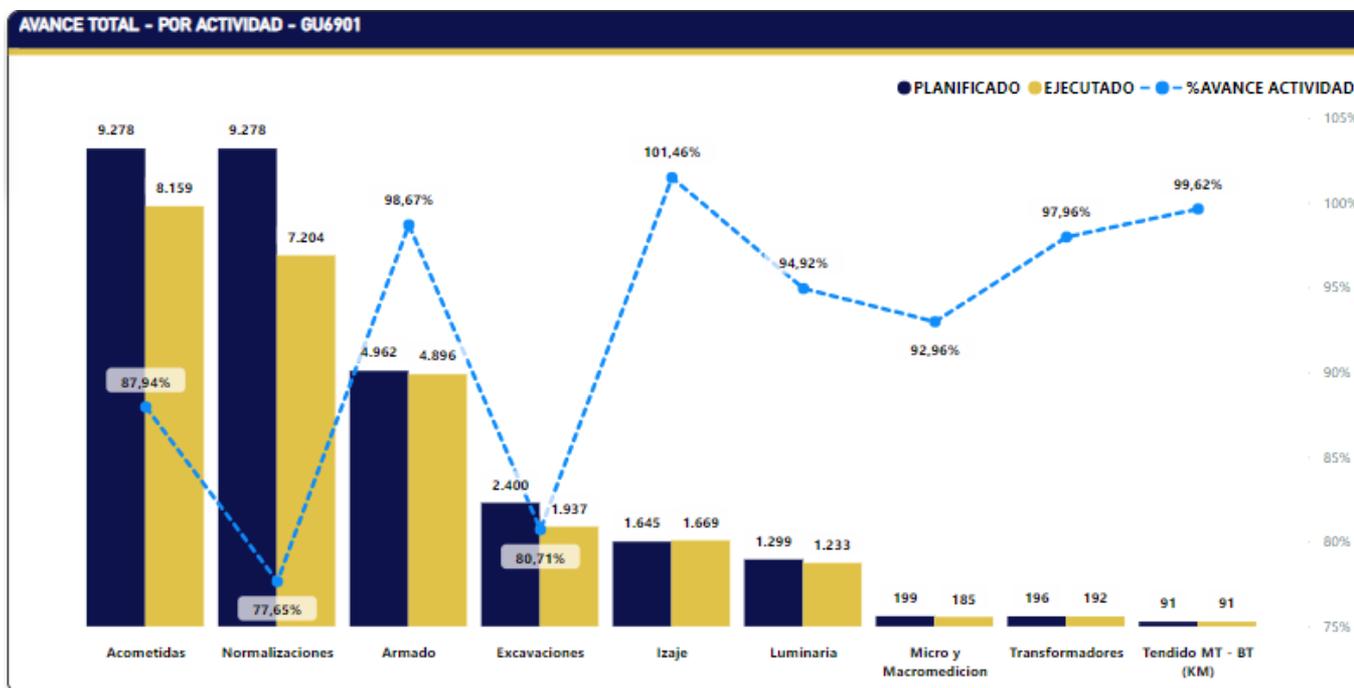


Avance del Proyecto Circuito SPER02

La grafica muestra el avance de las actividades previa para las 21,506 normalizaciones programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto.

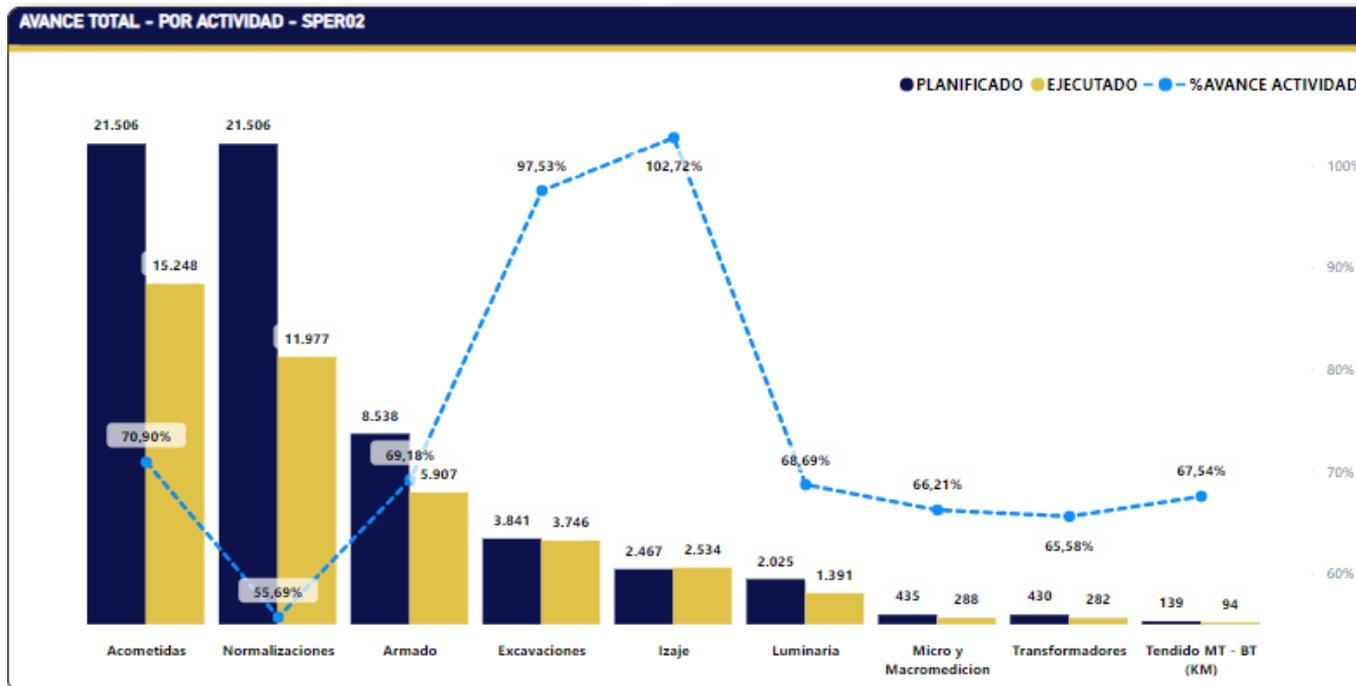


Avance del Proyecto Circuito VIME06

La grafica muestra el avance de las actividades previa para las 17,257 normalizaciones programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto.

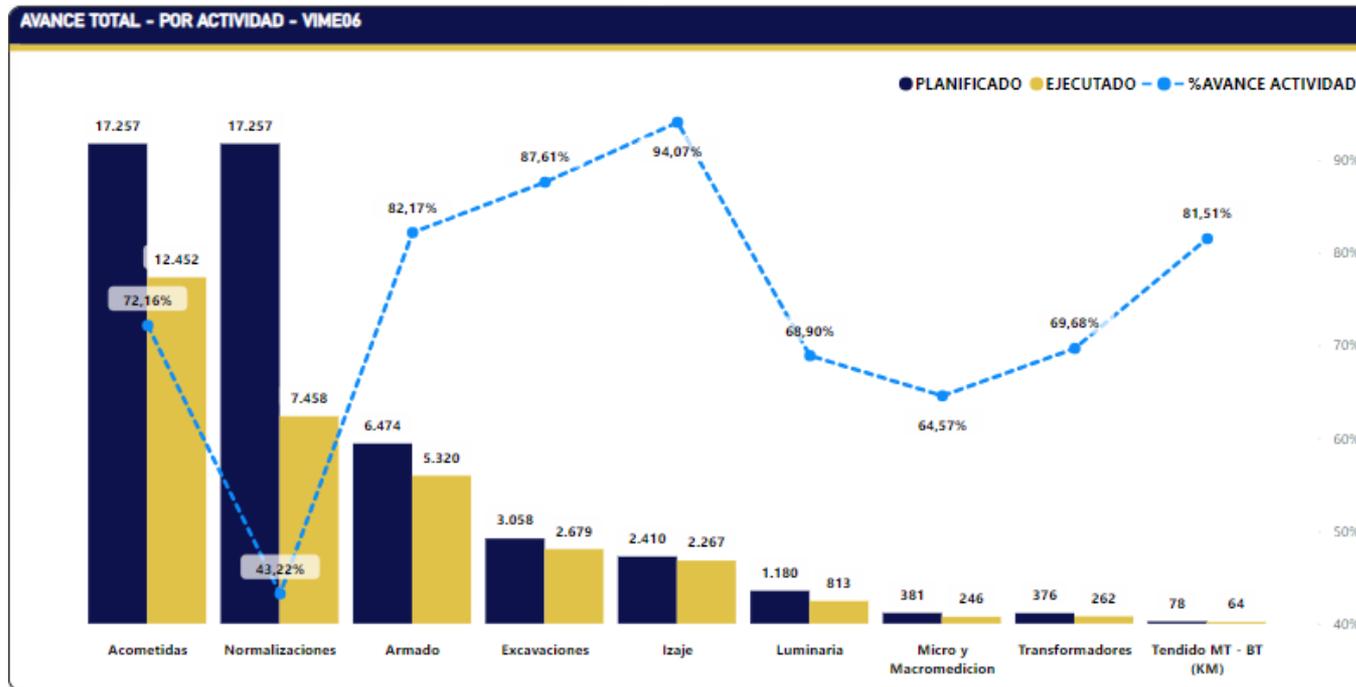

Avance del Proyecto Circuito LM6902

La grafica muestra el avance de las actividades previa para las 20,948 normalizaciones programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto.

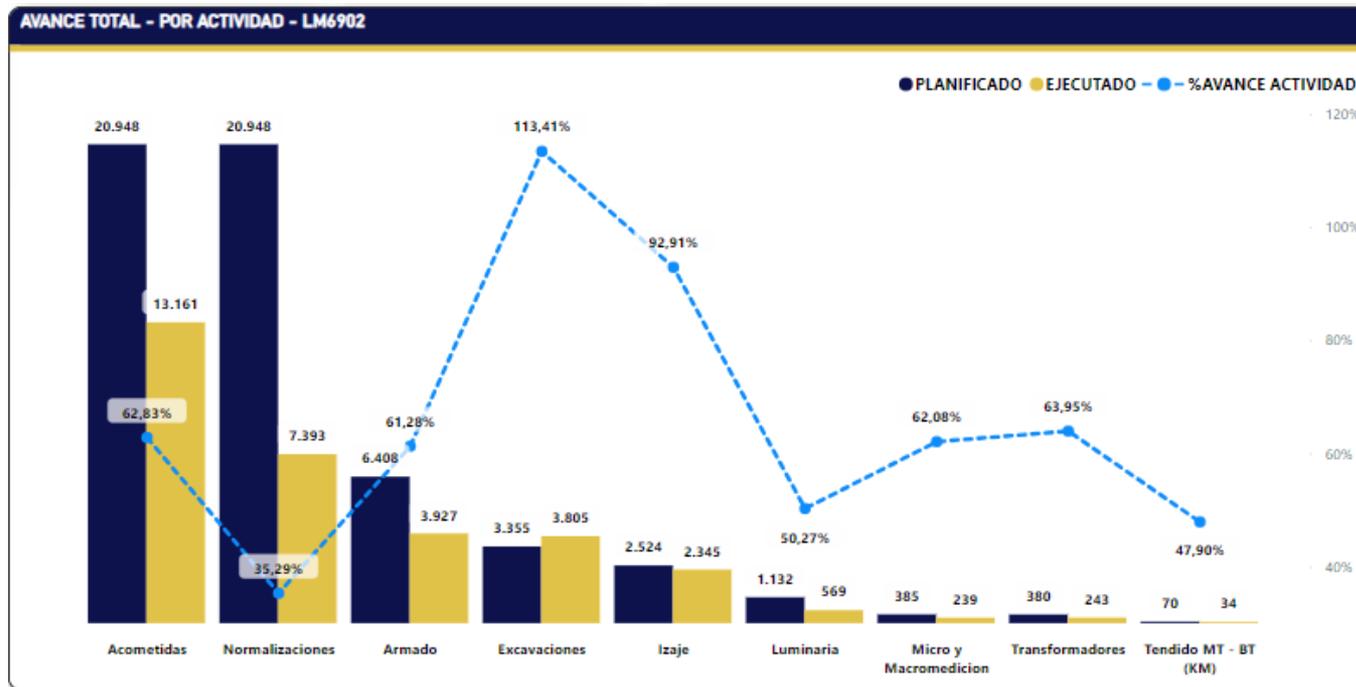

Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico



MATRIZ PRESENTACIÓN AVANCES GESTIÓN SOCIAL						
GESTIÓN SOCIAL EDEESTE						
FINANCIAMIENTO OFID-III			Octubre			
Actividades	Mes	Meta Circuito	Acumulado			Porcentaje de Avance
			Meses anteriores	Mes actual	Total	
Cantidad Personas Sensibilizadas	Octubre	79,719	85,261	-	85,261	107%
Cantidad de personas capacitadas		30,592	65,642	1,338	66,980	219%
Cantidad adultos Capacitados		8,968	39,449	1,198	40,647	453%
Cantidad de charlas comunitarias		148	553	14	567	383%
Total de niño/as capacitados		17,438	29,396	460	29,856	171%
Cantidad de Charlas en escuelas.		349	441	-	441	126%
Cantidad de líderes capacitados		4,185	1,496	-	1,496	36%
Cantidad de Talleres para Líderes		167	134	-	134	80%
Cantidad de COSE formados		38	39	-	39	103%
Cantidad de Líderes Incluidos en COSE		283	289	-	289	102%
Pactos Sociales		5	-	-	-	0%
Electricistas Comunitarios Formados		156	6	-	6	4%
Cantidad de Casas Redes Internas Rehabilitadas		125	70	-	70	56%
Bombillas de Bajo Consumo Distribuidas		27,356	21,285	300	21,585	79%

En este mes socializamos 3,617 personas mediante puerta a puerta, Asimismo realizamos 6 reuniones a líderes con 247 participantes, 14 capacitaciones a la comunidad con 443 comunitarios. De igual forma, mediante puerta a puerta se capacitaron 460 infantes y 755 adultos. Posteriormente se apoyo a la comercial en los cobros móviles con un monto recaudado de \$15.874. y se captaron 584 nuevos clientes, se reportaron 6 averías las cuales fueron resueltas, finalmente realizamos la entrega de 300 bombillas de bajo consumo.

Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico



Resumen fotográfico gestión social

CALE02

Reunión con la Comunidad



Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico

Resumen fotográfico gestión social GU6901



Capacitación comunidad sector La Rabelo

Operativo de contratación



Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico



Resumen fotográfico gestión social LM6902

LM6902

Socialización con la comunidad La Isla

Reunión con la comunidad



Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico



Resumen fotográfico gestión social VIME06

Entrega de Bombillos bajo consumo



Capacitación a la comunidad



Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico



Resumen fotográfico gestión social SPER02

Capacitación en La Barquita



Capacitación sobre el Sistema Eléctrico Dominicano






Programas y Proyectos de Rehabilitación de Redes Eléctricas – BEI/OFID
Informe de Presupuesto de los Programas y Proyectos.

Octubre 2023

Avance Económico – Programas y Proyectos BEI/OFID

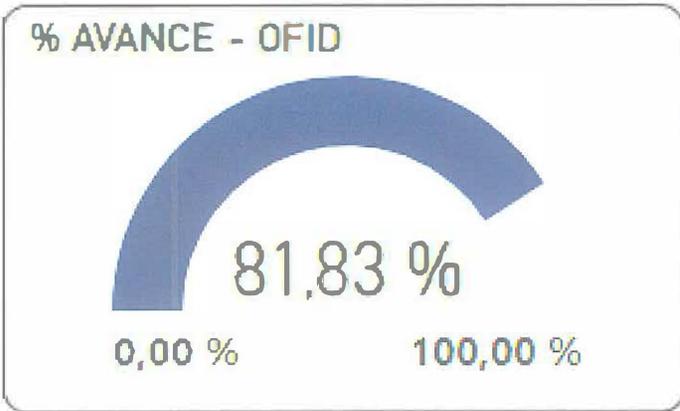

MONTO PRESUPUESTADO (\$US) - OFID

25,274,292.20

MONTO EJECUTADO (\$US) - OFID

22.746.890,37

Ryan Morel Clase
Ryan Morel Clase
Director de Proyectos
Dirección de Proyectos

