




Programas y Proyectos de Rehabilitación de Redes Eléctricas – BEI/OFID
Informe de Seguimiento de los Programas y Proyectos.

Febrero 2023

Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de Redes




A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de febrero 2023 correspondiente a la Licitación Pública Internacional No.LPI-BEI-01-2012 del Banco Europeo de Inversiones.

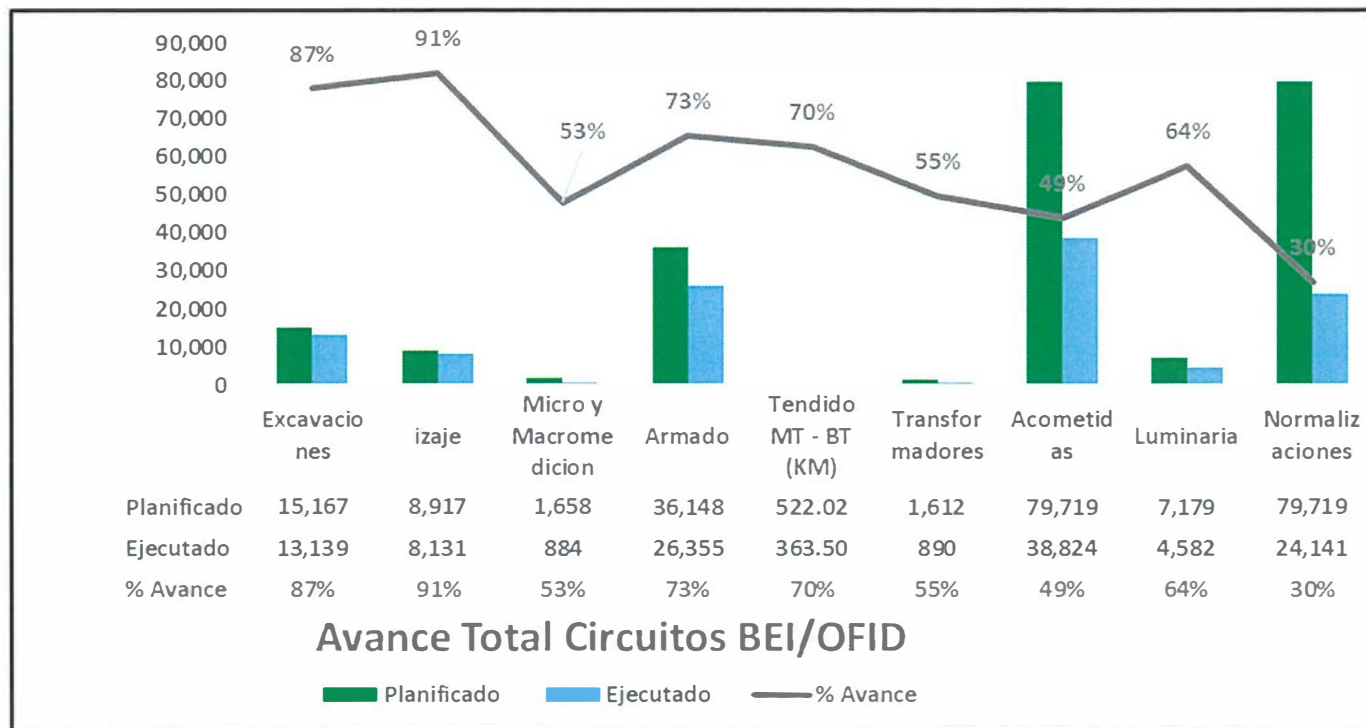


Avance del Proyecto Circuito CALE02

La grafica muestra el avance de las actividades previa para las 10,730 normalizaciones programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto.

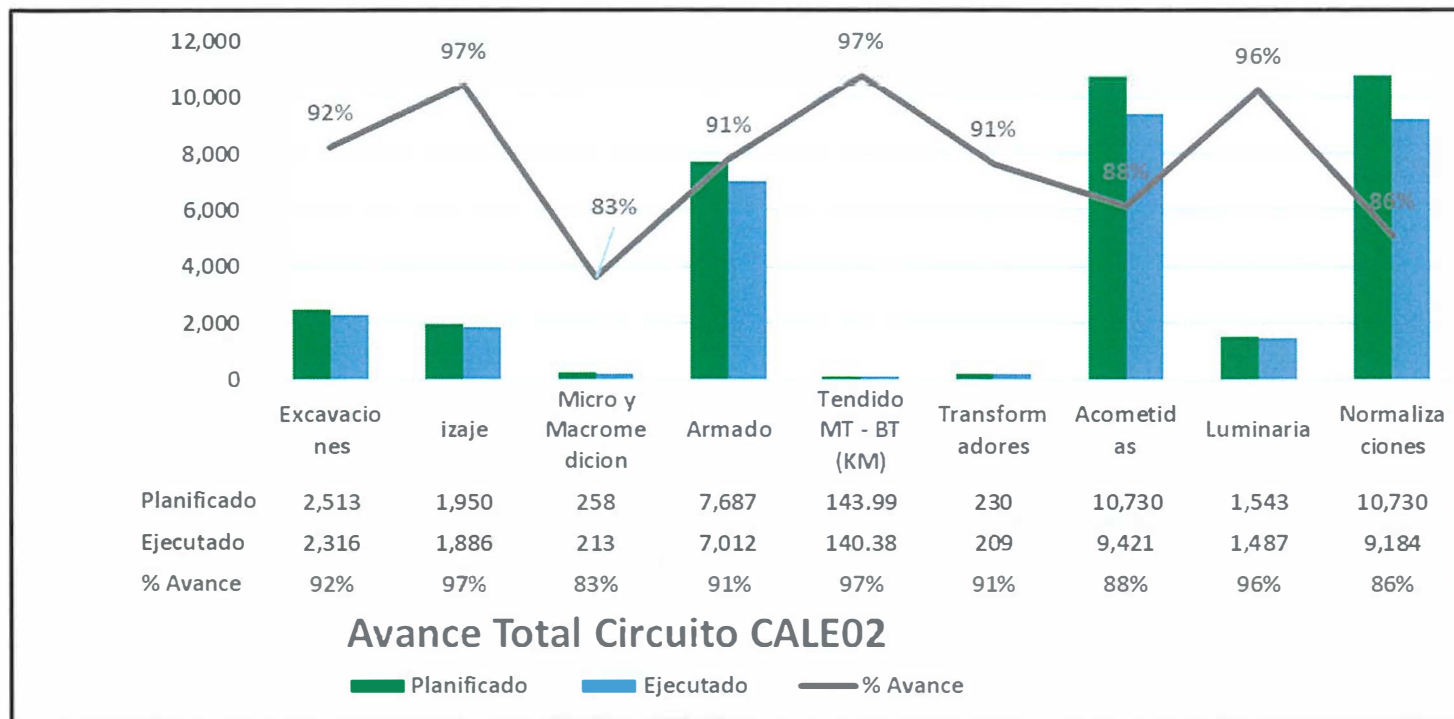


Avance del Proyecto Circuito GU6901

La grafica muestra el avance de las actividades previa para las 9,278 normalizaciones programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto.

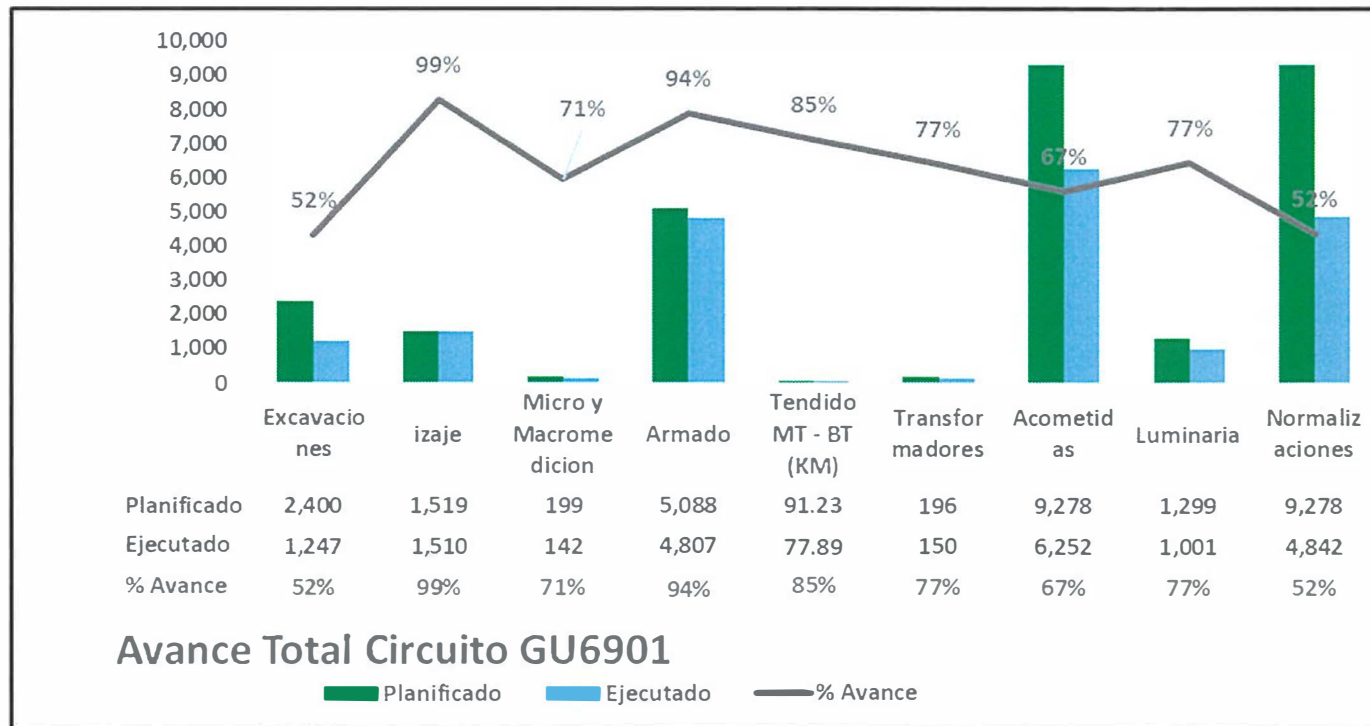


Avance del Proyecto Circuito SPER02

La grafica muestra el avance de las actividades previa para las 21,506 normalizaciones programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto.

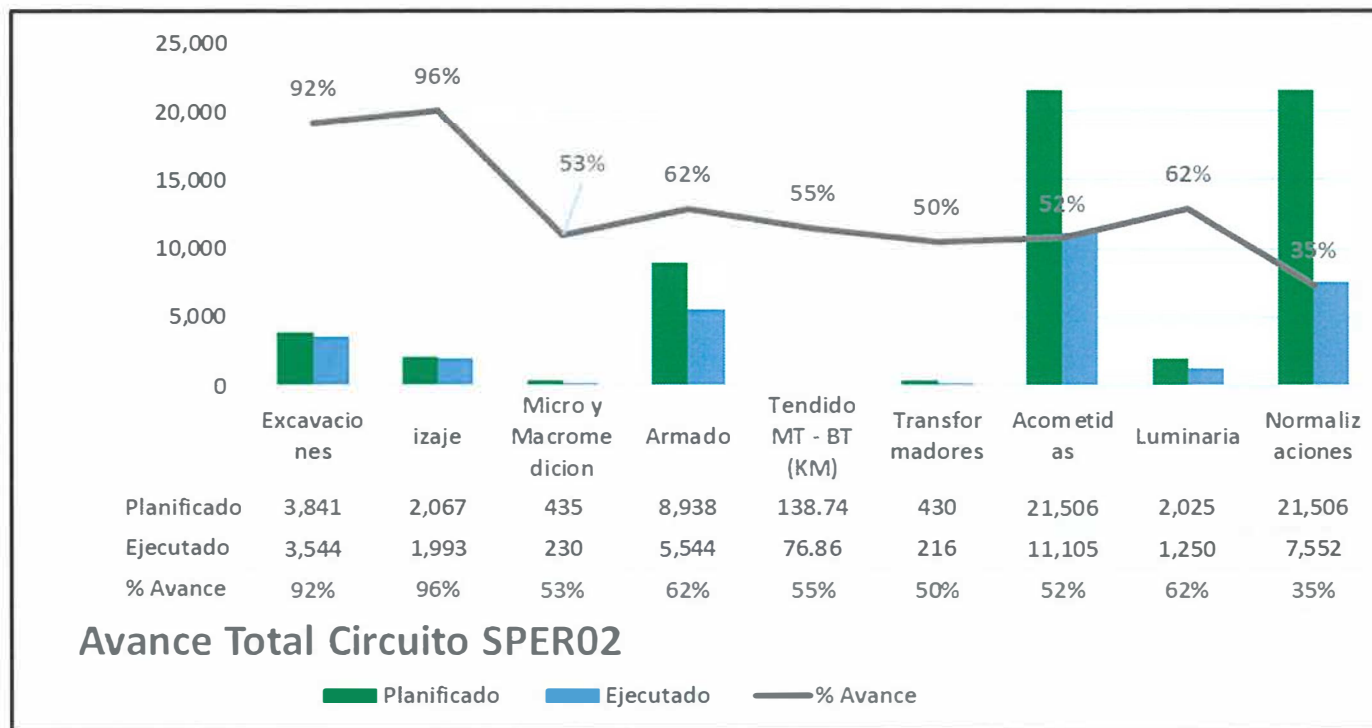


Avance del Proyecto Circuito VIME06

La grafica muestra el avance de las actividades previa para las 17,257 normalizaciones programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto.

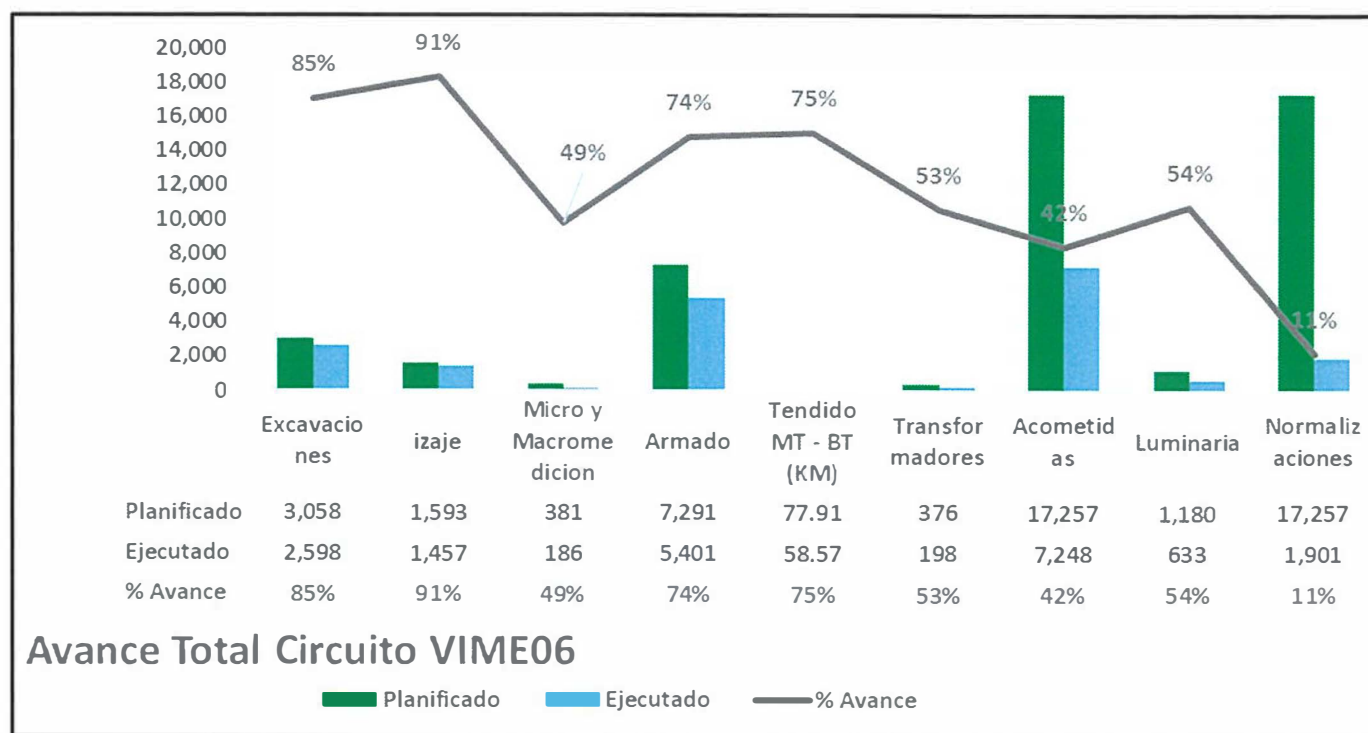

Avance del Proyecto Circuito LM6902

La grafica muestra el avance de las actividades previa para las 20,948 normalizaciones programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto.

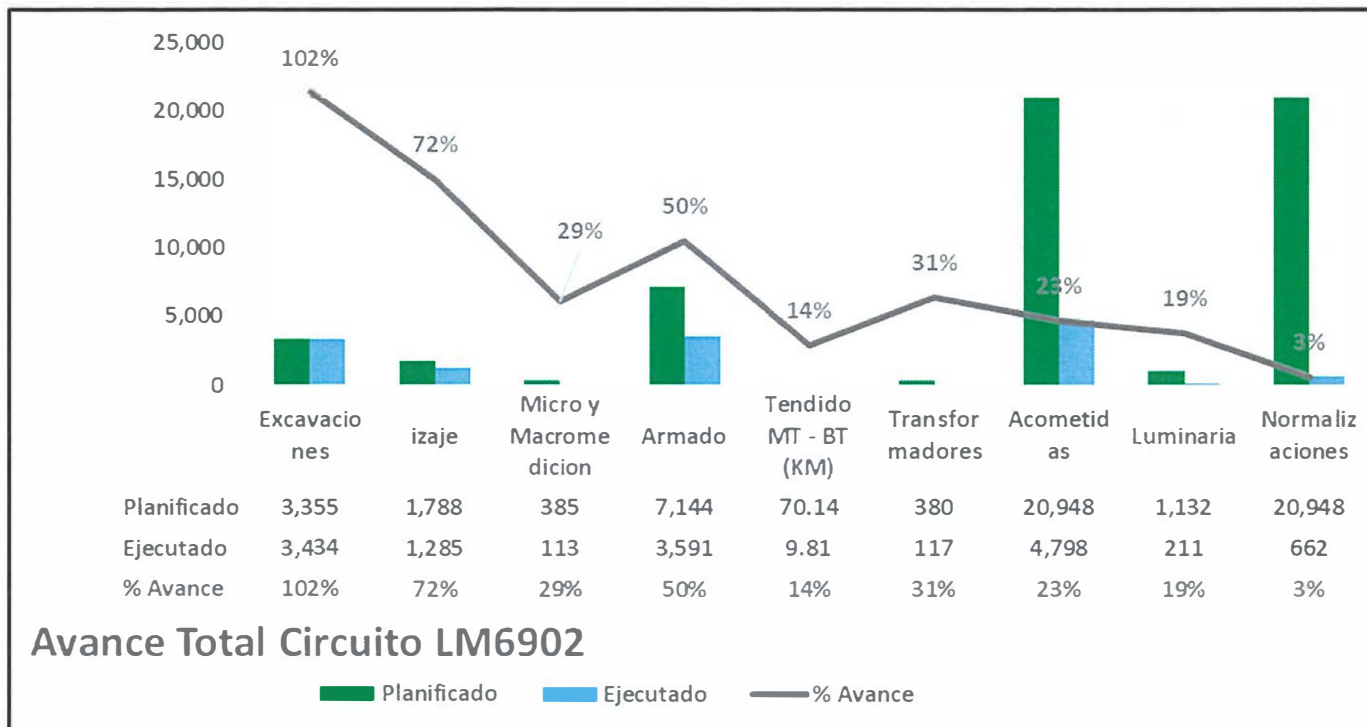

Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico



| MATRIZ PRESENTACION AVANCES GESTION SOCIAL GESTIÓN SOCIAL EDEESTE+A2:G27 FINANCIAMIENTO OFID-III Febrero 2023 | | | | | | |
|---|---------|---------------|------------------|------------|--------|----------------------|
| Actividades | Mes | Meta Circuito | Acumulado | | | Porcentaje de Avance |
| | | | Meses anteriores | Mes actual | Total | |
| Cantidad Personas Sensibilizadas | Febrero | 79,719 | 83,658 | 891 | 84,549 | 106% |
| Cantidad de personas capacitadas | | 30,592 | 39,568 | 2,768 | 42,336 | 138% |
| Cantidad adultos Capacitados | | 8,968 | 21,238 | 2,605 | 23,843 | 266% |
| Cantidad de charlas comunitarias | | 148 | 467 | 26 | 493 | 333% |
| Total de niño/as en escuelas | | 17,438 | 17,323 | - | 17,323 | 99% |
| Cantidad de Charlas en escuelas. | | 349 | 429 | - | 429 | 123% |
| Cantidad de lideres capacitados | | 4,185 | 1,007 | 163 | 1,170 | 28% |
| Cantidad de Talleres para Lideres | | 167 | 59 | 8 | 67 | 40% |
| Cantidad de COSE formados | | 38 | 39 | - | 39 | 103% |
| Cantidad de Lideres Incluidos en COSE | | 283 | 289 | - | 289 | 102% |
| Pactos Sociales | | 5 | - | - | - | 0% |
| Electricistas Comunitarios Formados | | 156 | 6 | - | 6 | 4% |
| Cantidad de Casas Redes Internas Rehabilitadas | | 125 | 70 | - | 70 | 56% |
| Bombillas de Bajo Consumo Distribuidas | | 18,750 | 8,750 | - | 8,750 | 47% |
| Otras actividades importantes realizadas durante el periodo: | | | | | | |
| <p>En este mes sensibilizamos a 891 personas mediante puerta a puerta y socializamos a 3,088. Asimismo, cumplimos 1 reunión comunitaria con 23 ciudadanos, logramos 8 capacitaciones a líderes con 163 y realizamos 26 capacitaciones a la comunidad con 1,301 personas. Cabe destacar que logramos capacitar mediante puerta a puerta a 905 niños y 1,304 adultos. posteriormente captamos 272 nuevos clientes, identificamos 80 marcado de voltajes, 3 averías fueron resueltas, 6 conflictos fueron mitigados y se reportaron 4 anomalías.</p> | | | | | | |

Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico

Resumen fotográfico gestión social



Reunión comunitaria, GU6901



Socialización puerta a puerta, GU6901

Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico

Resumen fotográfico gestión social



Socialización puerta a puerta, LM6902



Apoyo a obras, LM6902



Recorrido en terreno , LM6902



Ryan Morel Clase 2240
Ryan Morel Clase Director de Proyectos
Dirección de Proyectos



European
Investment
Bank






Programas y Proyectos de Rehabilitación de Redes Eléctricas – BEI/OFID
Informe de Presupuesto de los Programas y Proyectos.

Febrero 2023

Avance Económico – Programas y Proyectos BEI

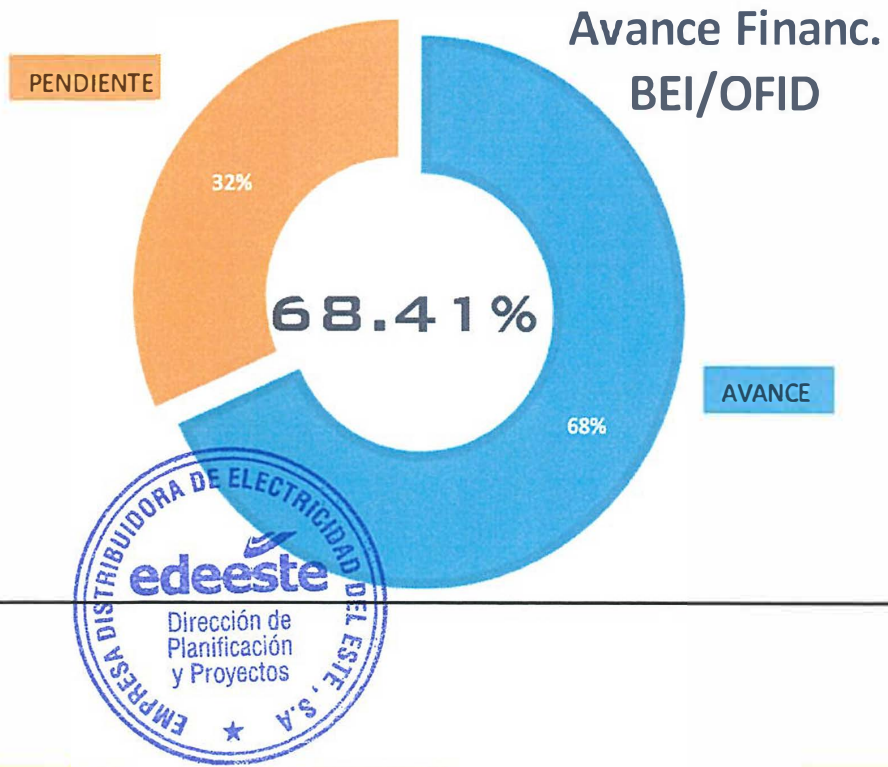

Avance Económico OFID

| | | |
|-------------------------|--------------------------|--------|
| Costo Total | USD 26,165,280.80 | 100.0% |
| Costo Total MA | USD 14,836,857.50 | 56.7% |
| Costo Total MO | USD 11,328,423.29 | 43.3% |
| Monto Ejecutado | USD 10,531,483.02 | 40.2% |
| Ejecutado MA | USD 6,474,066.99 | 43.6% |
| Ejecutado MO | USD 4,057,416.03 | 35.8% |
| Monto Restante | USD 15,633,797.78 | 59.8% |
| Restante MA | USD 8,362,790.52 | 56.4% |
| Restante MO | USD 7,271,007.26 | 64.2% |
| Monto Cubicado | USD 13,766,053.00 | 52.6% |
| Cubicado MA | USD 8,612,234.37 | 58.0% |
| Cubicado MO | USD 5,153,818.62 | 45.5% |
| Monto Disponible | USD 12,399,227.80 | 47.4% |

Ryan Morel Clases 2240
 Ryan Morel Clase Director de Proyectos
 Dirección de Proyectos
