



# Programas y Proyectos de Rehabilitación de Redes Eléctricas – BM

Informe de Seguimientos a los Programas y Proyectos


**Enero 2023**

# Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de redes




## Avance total de los Proyectos

A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de Enero 2023 correspondientes a la Licitación Pública Internacional No. SI-LPI-BM-01-2017 del Banco Mundial.

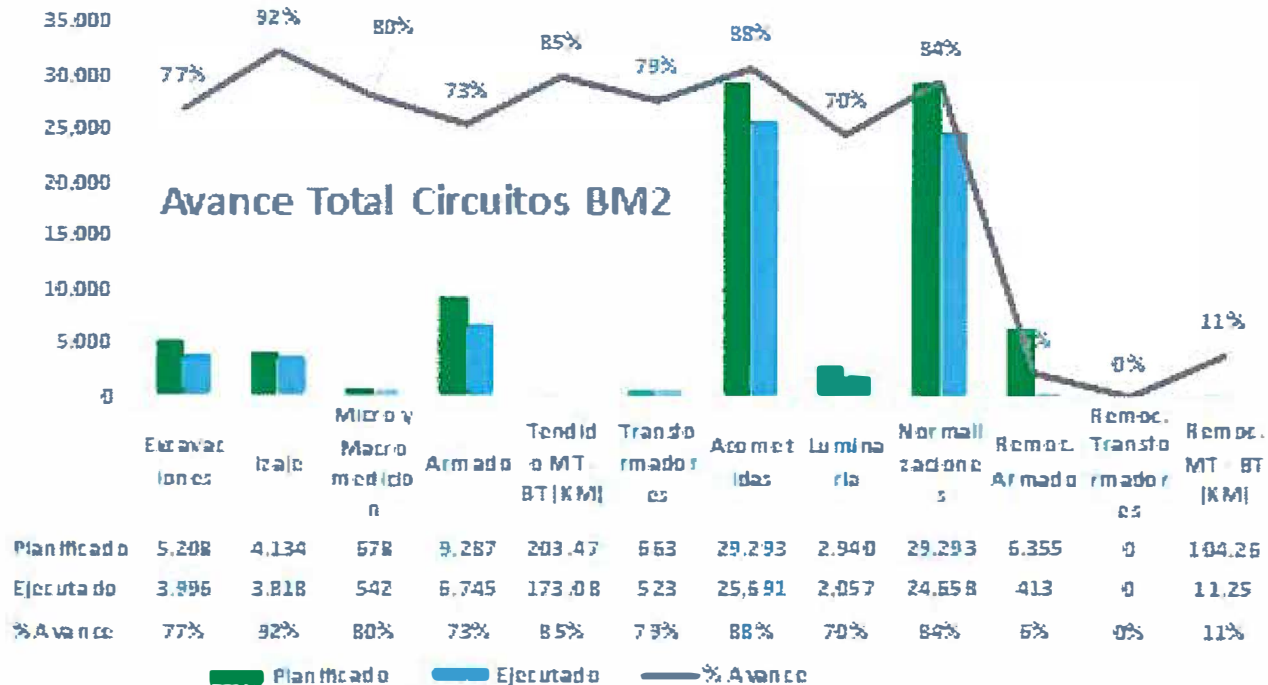

## Avance del Proyecto Circuito HAMO04

La siguiente grafica muestra un avance de 79% normalizaciones ejecutadas a la fecha del total planificado equivalente a 17,474 programadas a ejecutarse al final del proyecto.

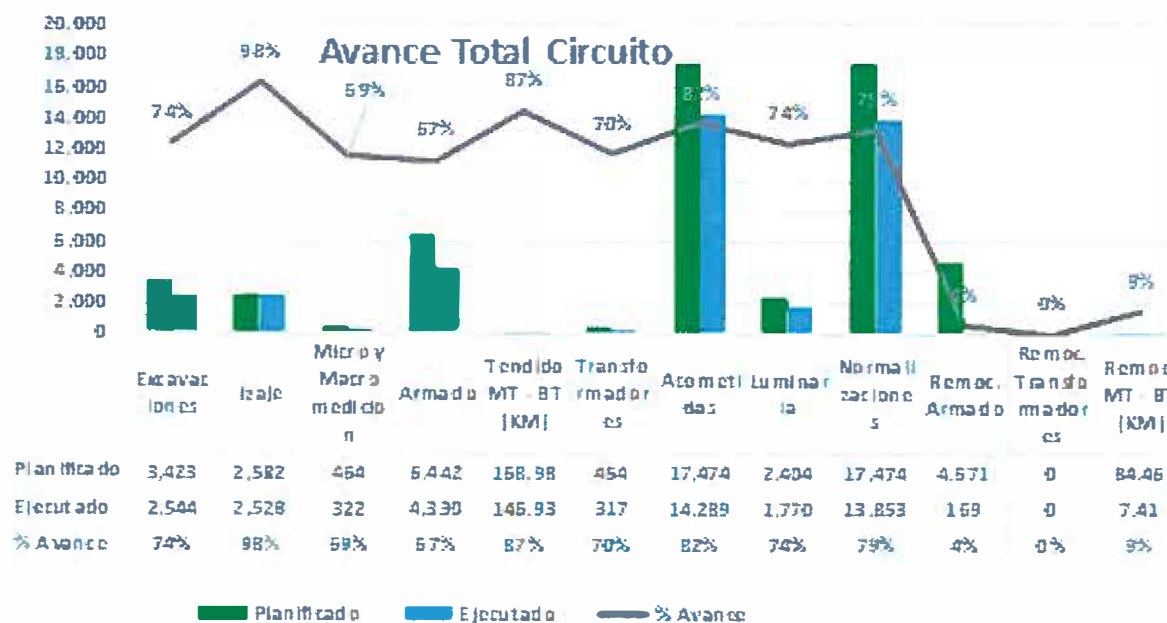


**BANCO MUNDIAL**  
BIRF • AIF



## Avance del Proyecto Circuito TIM201

La siguiente grafica muestra un avance de 91% normalizaciones ejecutadas a la fecha del total planificado equivalente a 11,819 programadas a ejecutarse al final del proyecto.

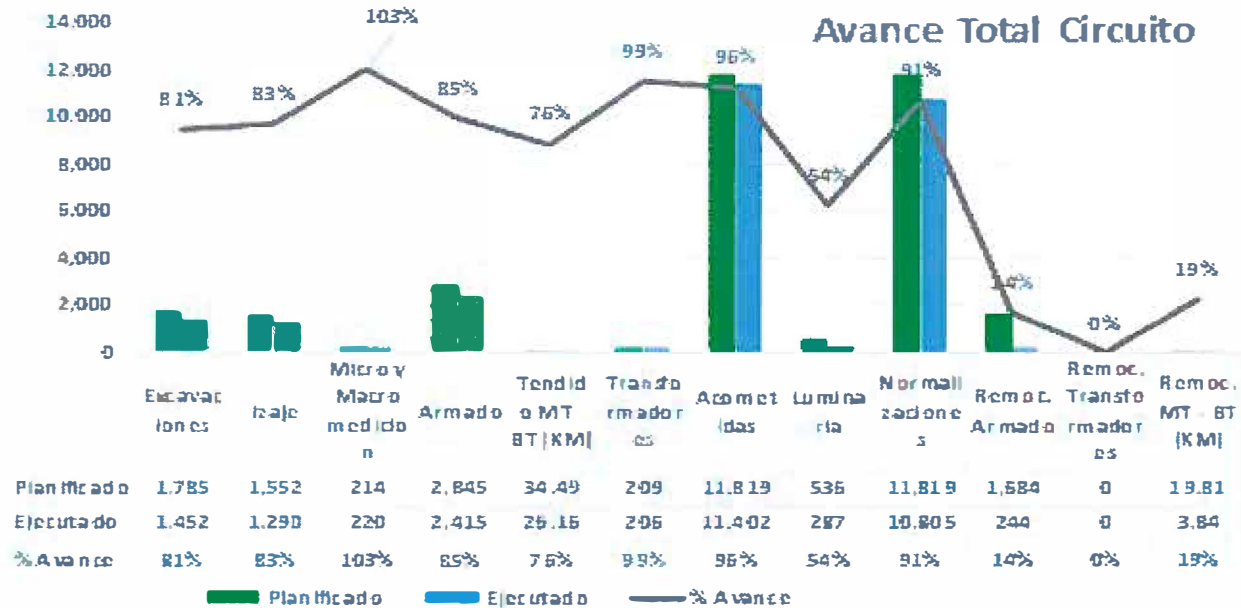

**BANCO MUNDIAL**  
BIRF - AIF



# Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico



## Resumen actividades al cierre del mes.

Actividades	Mes	Meta Circuito	Acumulado			Porcentaje de Avance
			Meses anteriores	Mes actual	Total	
Cantidad personas sensibilizadas	Enero	29,293	30,921	-	30,921	106%
Cantidad de personas capacitadas		11,242	8,647	-	8,647	77%
Cantidad adultos capacitados		3,296	2,304	-	2,304	70%
Cantidad de charlas comunitarias		55	64	-	64	116%
Total de niño/as en escuelas		6,507	6,290	-	6,290	97%
Cantidad de charlas en escuelas.		128	74	-	74	58%
Cantidad de líderes capacitados		1,537	53	-	53	3%
Cantidad de talleres para líderes		62	3	-	3	5%
Cantidad de COSE formados		11	11	-	11	100%
Cantidad de Líderes Incluidos en COSE		86	86	-	86	100%
Pactos Sociales		2	2	-	2	100%
Electricistas Comunitarios Formados		61	61	-	61	100%
Cantidad de Casas Redes Internas Rehabilitadas		67	-	-	-	0%
Bombillas de Bajo Consumo Distribuidas		12,600	11,600	-	11,600	92%
<b>Otras actividades importantes realizadas durante el periodo:</b>						
No se reportaron actividades en estos circuitos.						



Ryan Morel Clase 2240  
 Ryan Morel Clase Director de Proyectos  
 Dirección de Proyectos



**BANCO MUNDIAL**  
 BIRF • AIF





# Programas y Proyectos de Rehabilitación de Redes Eléctricas – BM


## Informe de Presupuestos Programas y Proyectos

Enero 2023

# Avance Económico - Programas y Proyectos



A continuación avance económico de los trabajos ejecutados a la fecha en la Rehabilitación de los circuitos BM.

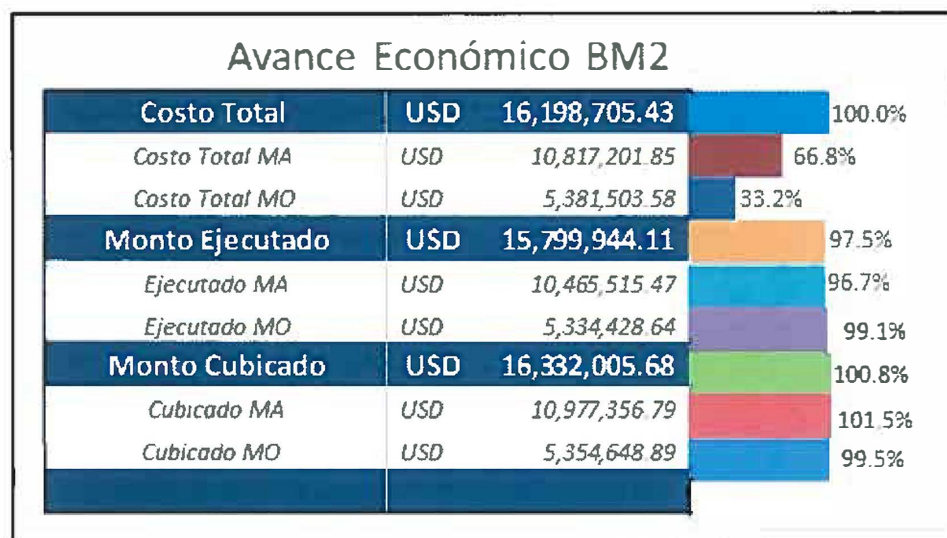

**AVANCE  
EJECUCIÓN  
FINANC. BM2**



Ryan Morel Clase 2240

Ryan Morel Clase Director de Proyectos  
Dirección de Proyectos



**BANCO MUNDIAL**  
BIRF - AIF

