




Programas y Proyectos de Rehabilitación de Redes Eléctricas – BM
Informe de Seguimientos a los Programas y Proyectos

Enero 2022

Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de redes


Avance total de los Proyectos

A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de enero 2022 correspondientes a la Licitación Pública Internacional No. SI-LPI-BM-01-2017 del Banco Mundial.

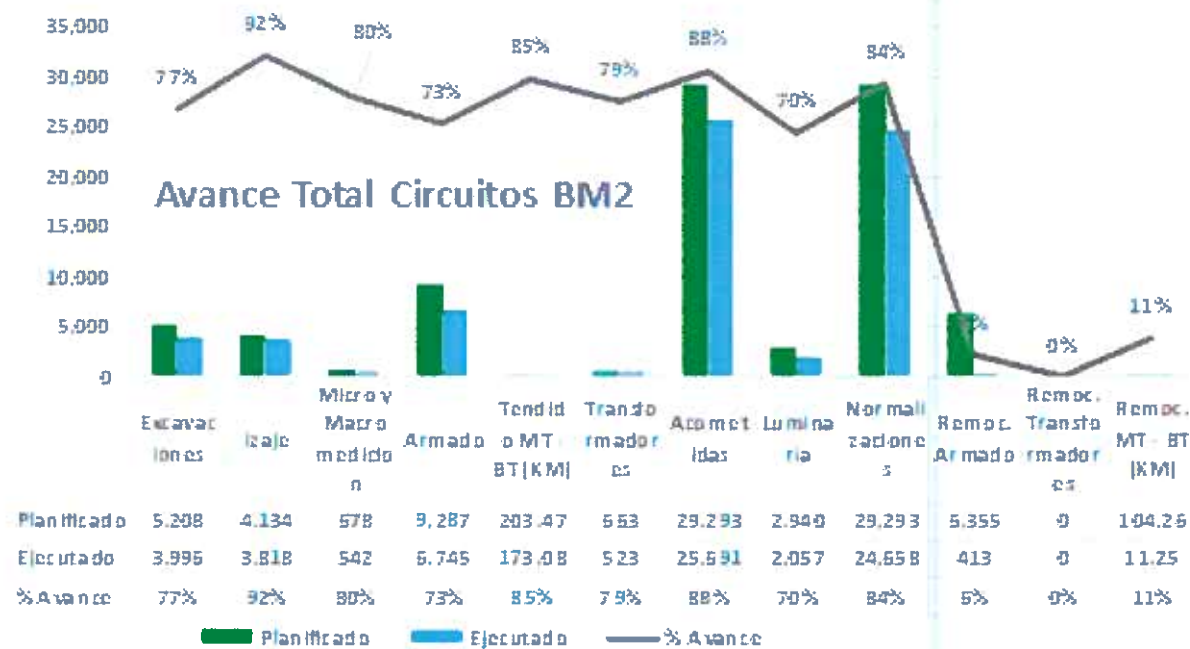


Avance del Proyecto Circuito HAMO04

La siguiente grafica muestra un avance de 61% normalizaciones ejecutadas a la fecha del total planificado equivalente a 17,474 programadas a ejecutarse al final del proyecto.

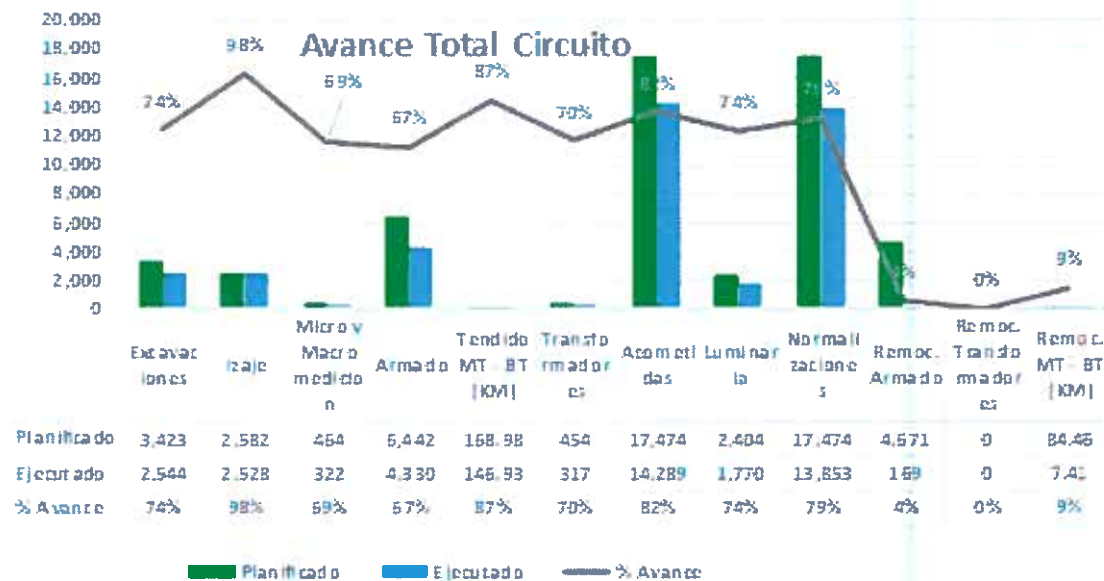

Avance del Proyecto Circuito TIM201

La siguiente grafica muestra un avance de 85% normalizaciones ejecutadas a la fecha del total planificado equivalente a 11,819 programadas a ejecutarse al final del proyecto.

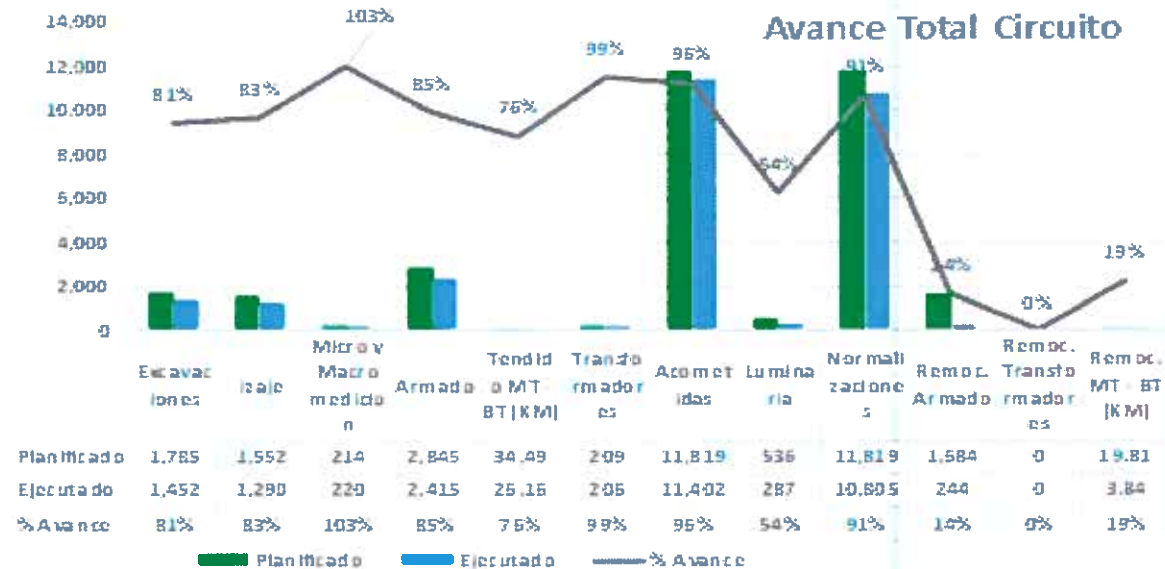

Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico



Resumen actividades al cierre del mes.

MATRIZ PRESENTACIÓN AVANCES GESTIÓN SOCIAL GESTIÓN SOCIAL EDEESTE FINANCIAMIENTO BM Enero 2022						
Actividades	Mes	Meta Circuito	Acumulado			Porcentaje de Avance
			Meses anteriores	Mes actual	Total	
Cantidad Personas Sensibilizadas	Enero	41,922	41,636	48	41,684	99%
Cantidad de personas capacitadas		16,088	11,039	-	11,039	69%
Cantidad adultos Capacitados		4,717	2,304	-	2,304	49%
Cantidad de charlas comunitarias		79	62	-	62	78%
Total de niño/as en escuelas		9,170	8,703	-	8,703	95%
Cantidad de Charlas en escuelas.		183	107	-	107	58%
Cantidad de líderes capacitados		2,200	32	-	32	1%
Cantidad de Talleres para Líderes		89	2	-	2	2%
Cantidad de COSE formados		16	17	-	17	106%
Cantidad de Líderes Incluidos en COSE		120	127	-	127	106%
Pactos Sociales		3	3	-	3	100%
Electricistas Comunitarios Formados		125	61	-	61	49%
Cantidad de Casas Redes Internas Rehabilitadas		100	-	-	-	0%
Bombillas de Bajo Consumo Distribuidas		13,267	11,600	-	11,600	87%
Otras actividades importantes realizadas durante el período:						
Durante el mes se realizaron 48 sensibilizaciones, Así mismo 1 reunión con líderes con 6 participantes, y 3 socializaciones puerta/puerta logrando involucrar 175 persona. Y se realizaron 2 marcaciones.						



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF



Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico



Resumen fotográfico gestión social.



Socialización,
TIMB201



Socialización,
sobre el uso
eficiente de la
energía.
HAMO04



Socialización,
TIMB201



Socialización
sector el
establo,
HAMO04


Carlos Sánchez Gte. Líder de Planificación y Proyectos
Dirección de Proyectos y Gestión de Pérdidas



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF





Programas y Proyectos de Rehabilitación de Redes Eléctricas – BM



Informe de Presupuestos Programas y Proyectos

Enero 2022



Avance Económico - Programas y Proyectos

A continuación avance económico de los trabajos ejecutados a la fecha en la Rehabilitación de los circuitos BM.

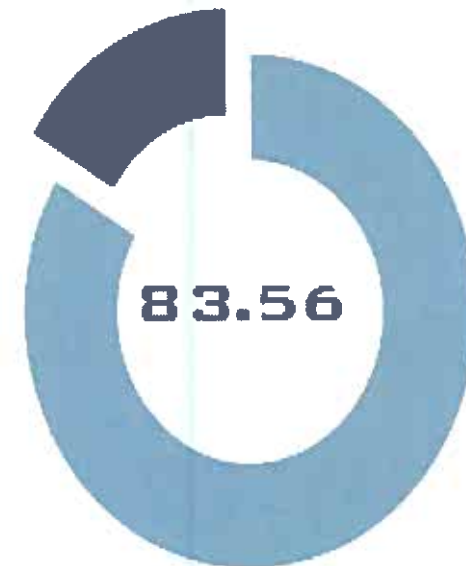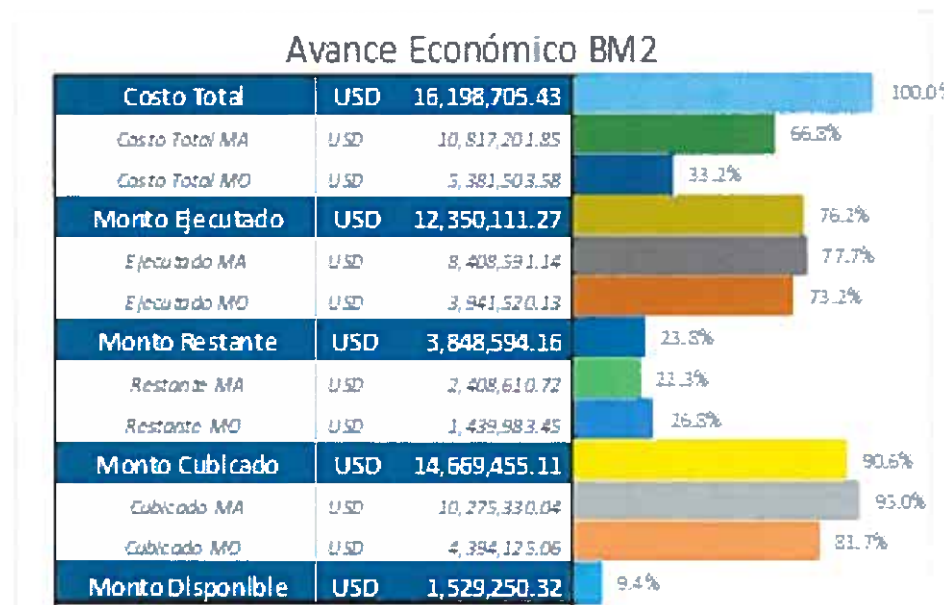

**AVANCE FINANC.
BM2**


Carlos Sanchez Gte. Líder de Planificación y Proyectos
Dirección de Proyectos y Gestión de Pérdidas

