




Programas y Proyectos de Rehabilitación de Redes Eléctricas – BM
Informe de Seguimientos a los Programas y Proyectos


Mayo 2022



Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de redes

Avance total de los Proyectos

A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de mayo 2022 correspondientes a la Licitación Pública Internacional No. SI-LPI-BM-01-2017 del Banco Mundial.

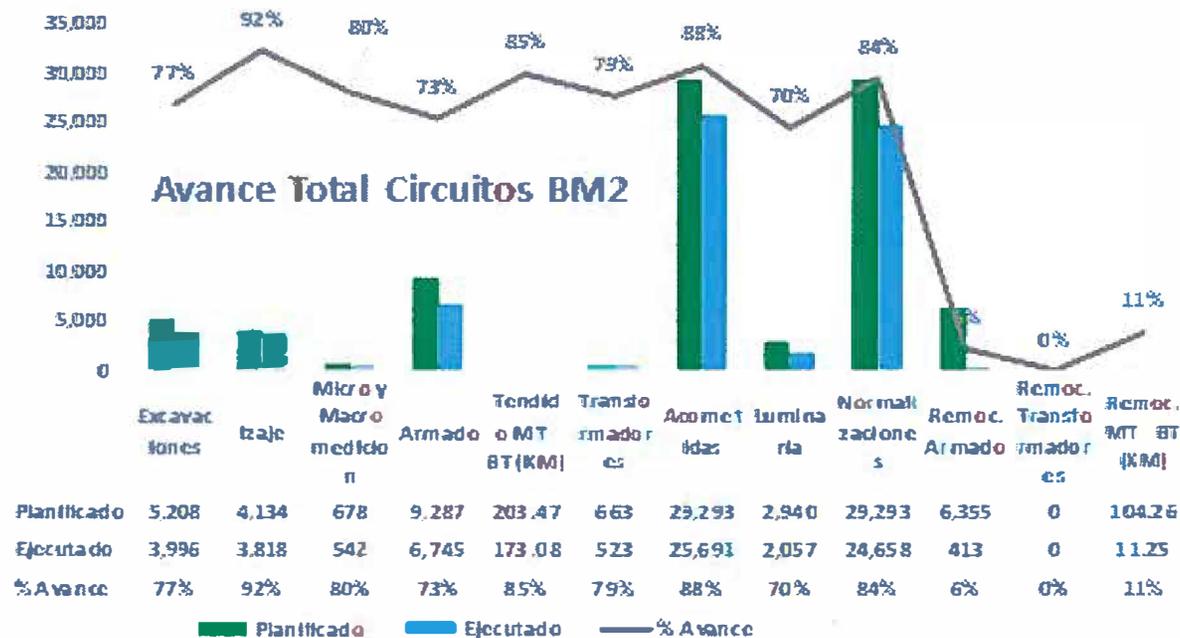


Avance del Proyecto Circuito HAM004

La siguiente grafica muestra un avance de 61% normalizaciones ejecutadas a la fecha del total planificado equivalente a 17,474 programadas a ejecutarse al final del proyecto.




Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas

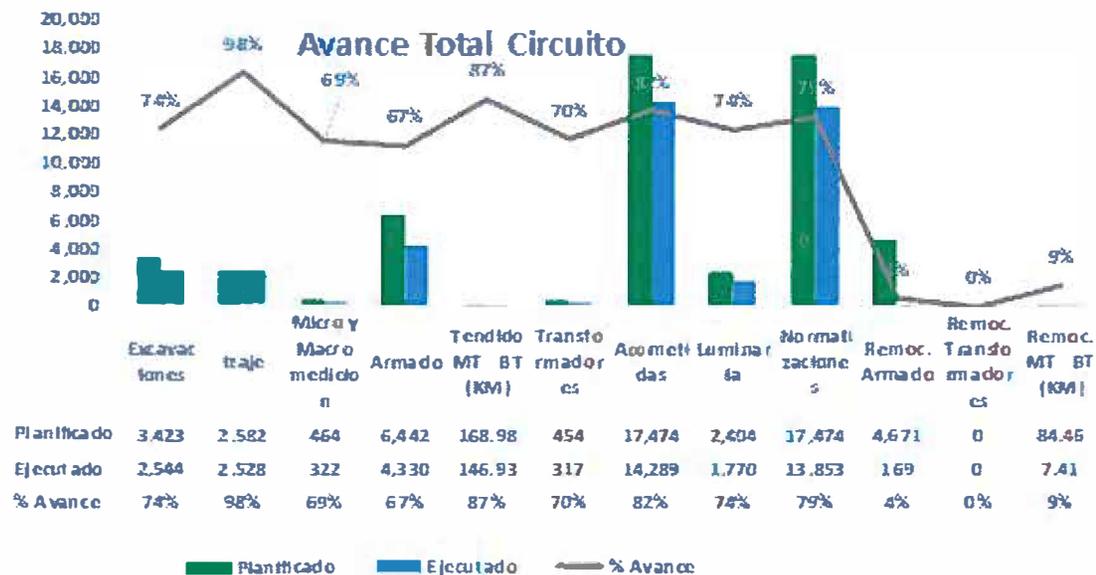

Avance del Proyecto Circuito TIM201

La siguiente grafica muestra un avance de 85% normalizaciones ejecutadas a la fecha del total planificado equivalente a 11,819 programadas a ejecutarse al final del proyecto.

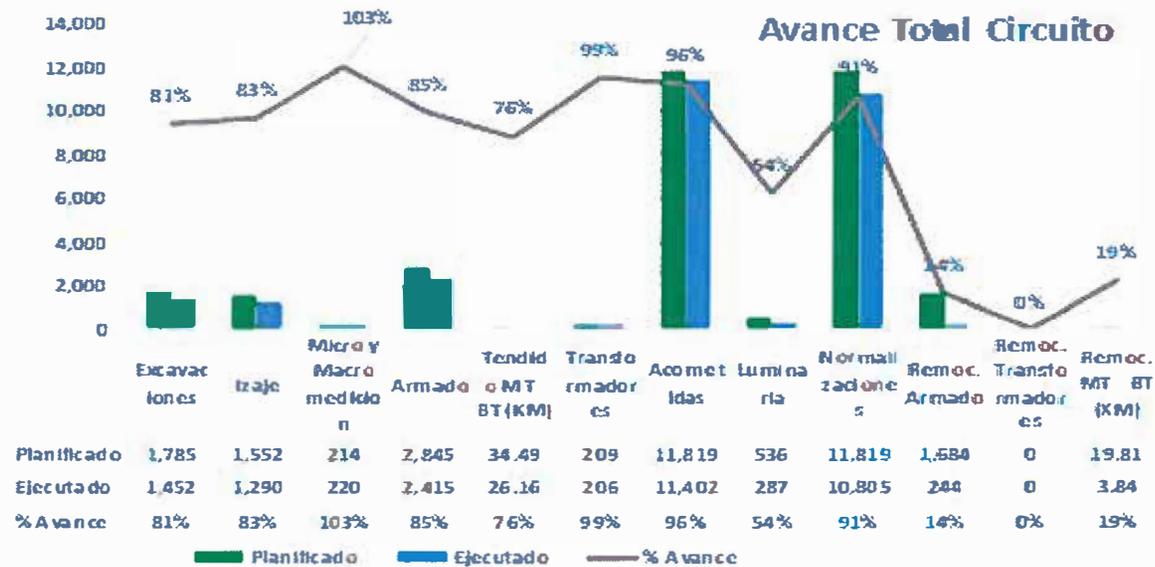

Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico

Resumen actividades al cierre del mes.

Actividades	Mes	Meta Circuito	Acumulado			Porcentaje de Avance
			Meses anteriores	Mes actual	Total	
Cantidad Personas Sensibilizadas	Mayo	29,293	30,921	-	30,921	106%
Cantidad de personas capacitadas		11,242	8,533	22	8,555	76%
Cantidad adultos Capacitados		3,296	2,304	-	2,304	70%
Cantidad de charlas comunitarias		55	62	-	62	113%
Total de niño/as en escuelas		6,407	6,209	-	6,209	97%
Cantidad de Charlas en escuelas.		128	71	-	71	55%
Cantidad de líderes capacitados		1,537	20	22	42	3%
Cantidad de Talleres para Líderes		62	1	1	2	3%
Cantidad de COSE formados		11	11	-	11	100%
Cantidad de Líderes Incluidos en COSE		86	86	-	86	100%
Pactos Sociales		2	2	-	2	100%
Electricistas Comunitarios Formados		61	61	-	61	100%
Cantidad de Casas Redes Internas Rehabilitadas		67	-	-	-	0%
Bombillas de Bajo Consumo Distribuidas		11,600	11,600	-	11,600	100%

Otras actividades importantes realizadas durante el periodo:
 Durante el mes se realizó 1 socialización puerta a puerta con una participación 148 ciudadanos y 1 reunión con líderes donde acudieron 7 líderes.


 Carlos Sánchez Iste. Líder de Planificación y Proyectos
 Dirección de Proyectos y Gestión de Pérdidas



BANCO MUNDIAL
BIRF - AIF






Programas y Proyectos de Rehabilitación de Redes Eléctricas – BM

Informe de Presupuestos Programas y Proyectos

Mayo 2022




Avance Económico - Programas y Proyectos



A continuación avance económico de los trabajos ejecutados a la fecha en la Rehabilitación de los circuitos BM.

Avance Económico BM2

Costo Total	USD	16,196,705.43	100.0%
Costo Total MA	USD	10,817,201.85	66.8%
Costo Total MD	USD	5,381,503.58	33.2%
Monto Ejecutado	USD	12,350,111.27	76.2%
Ejecutado MA	USD	8,408,591.14	77.7%
Ejecutado MD	USD	3,941,520.13	73.2%
Monto Restante	USD	3,848,594.16	23.8%
Restante MA	USD	2,408,610.72	22.3%
Restante MD	USD	1,439,983.45	26.8%
Monto Cubicado	USD	14,669,455.11	90.6%
Cubicado MA	USD	10,275,330.04	93.0%
Cubicado MD	USD	4,394,125.06	81.7%
Monto Disponible	USD	1,529,250.32	9.4%

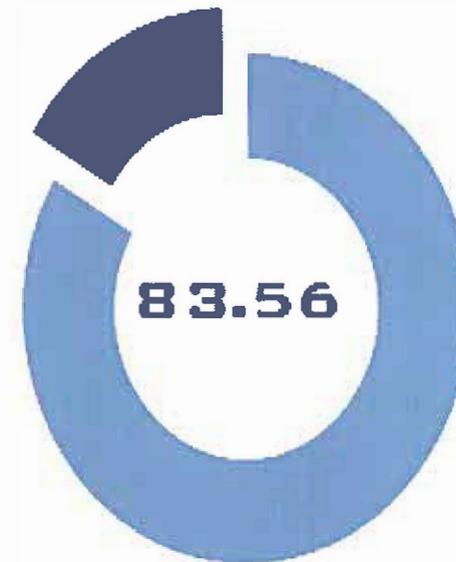

**AVANCE FINANCIERO
BM2**

Carlos Sanchez Gte.
8686



Carlos Sanchez Gte. Lider de Planificación y Proyectos
Dirección de Proyectos y Gestión de Pérdidas



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF

