




Programas y Proyectos de Rehabilitación de Redes Eléctricas – BEI
Informe de Seguimiento de los Programas y Proyectos.

Mayo 2022

Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de Redes



A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de Mayo 2022 correspondiente a la Licitación Pública Internacional No.LPI-BEI-01-2012 del Banco Europeo de Inversiones.

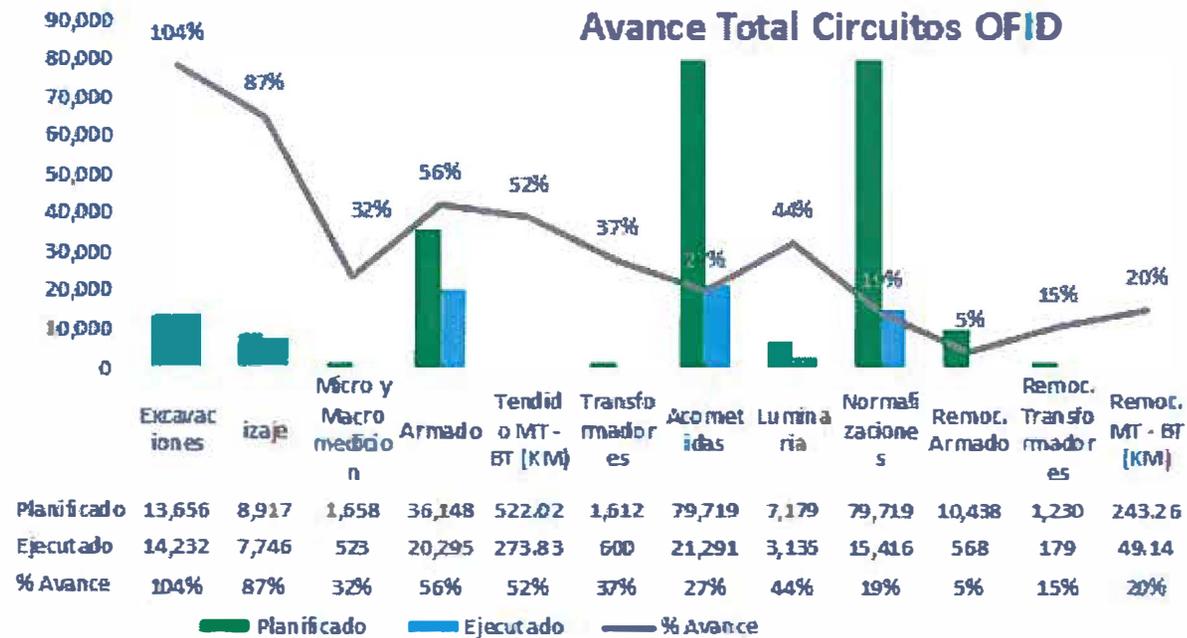


Avance del Proyecto Circuito CALE02

La siguiente grafica muestra un avance de las actividades previa para las 10,730 normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto.



edeeste

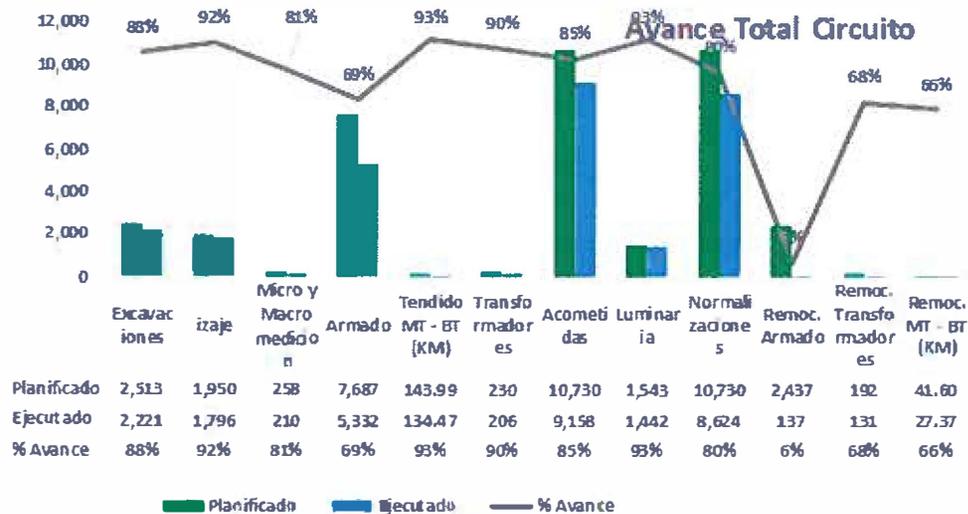

cdeee




European Investment Bank

edeeste

Avance del Proyecto Circuito GU6901

La siguiente grafica muestra un avance de las actividades previa para las 9,278 normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto.

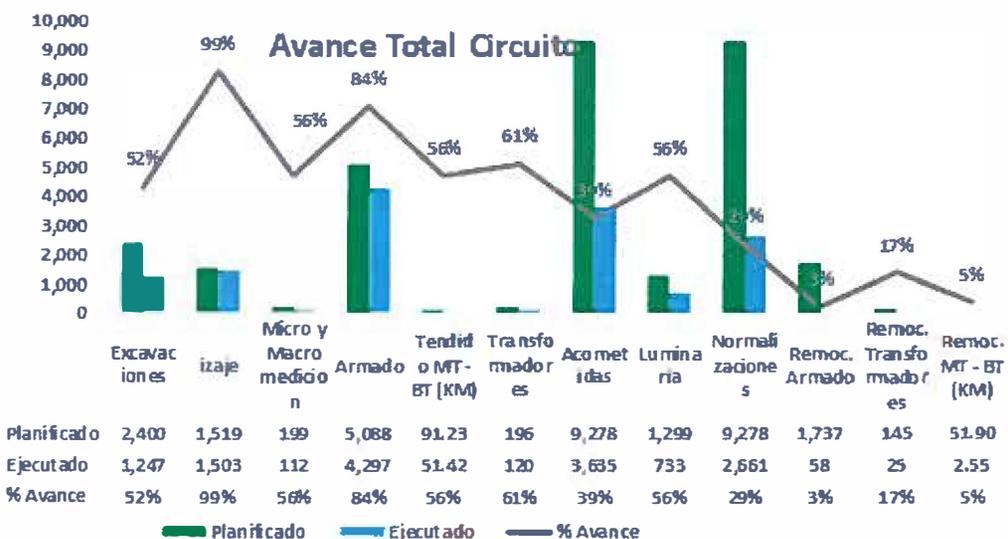


European Investment Bank



Avance del Proyecto Circuito SPER02

La siguiente grafica muestra un avance de las actividades previa para las 21,506 normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto.

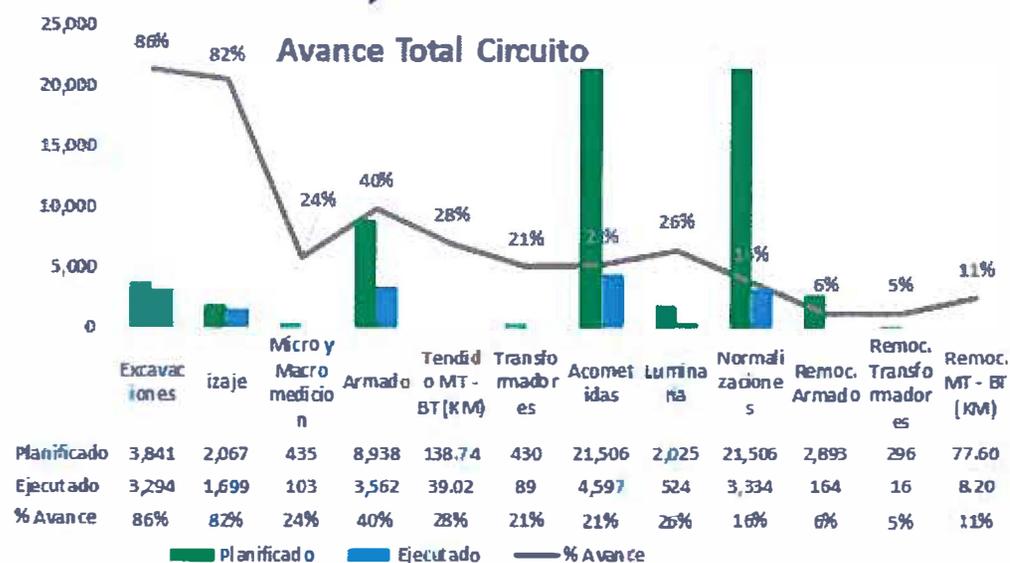


European Investment Bank



Avance del Proyecto Circuito VIME06

La siguiente grafica muestra un avance de las actividades previa para las 17,256 normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto.

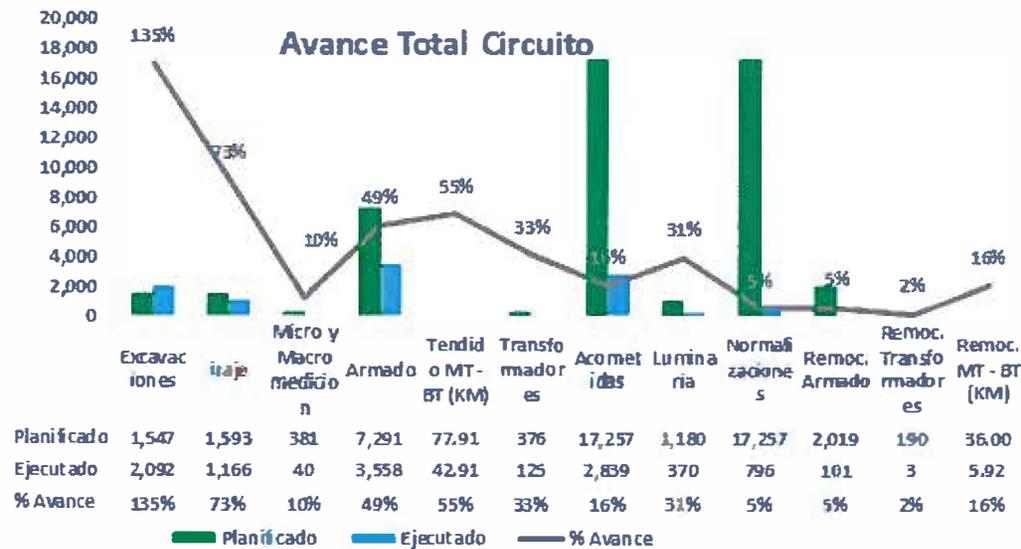


European Investment Bank



Avance del Proyecto Circuito LM6902

La siguiente grafica muestra un avance de las actividades previa para las 20,948 normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto.

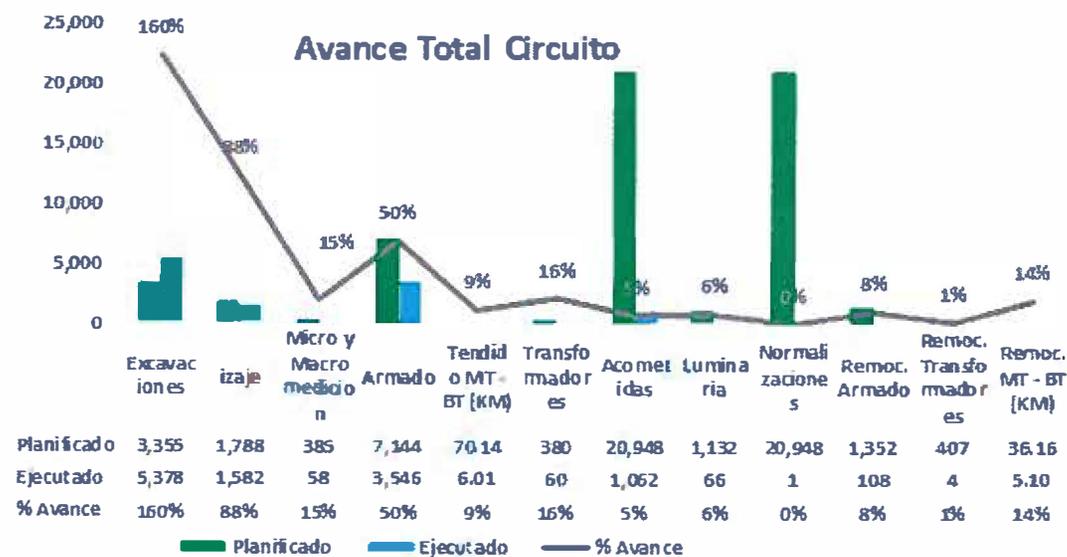

European Investment Bank



Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico

Actividades	Mes	Objetivo	Acumulado			Porcentaje de Avance	
			Meses anteriores	Mes actual	Total		
Cantidad Personas Sensibilizadas	Mayo	79,719	69,640	1,476	71,116	89%	
Cantidad de personas capacitadas		30,592	15,408	94	15,502	51%	
Cantidad adultos Capacitados		8,968	1,436	94	1,530	17%	
Cantidad de charlas comunitarias		148	52	5	57	39%	
Total de niño/as en escuelas		17,438	13,829	-	13,829	79%	
Cantidad de Charlas en escuelas.		349	374	-	374	107%	
Cantidad de líderes capacitados		4,185	143	-	143	3%	
Cantidad de Talleres para Líderes		167	13	-	13	8%	
Cantidad de COSE formados		38	39	-	39	103%	
Cantidad de Líderes Incluidos en COSE		283	289	-	289	102%	
Pactos Sociales		5	-	-	-	0%	
Electricistas Comunitarios Formados		156	-	-	-	0%	
Cantidad de Casas Redes Internas Rehabilitadas		125	-	-	-	0%	
Bombillas de Bajo Consumo Distribuidas		18,750	4,350	-	4,350	23%	
Otras actividades importantes realizadas durante el período:							
<p>En este mes identificamos 2 líderes nuevos, y sensibilizamos a 1,410 personas. Sostuvimos dos reuniones con líderes comunitarios donde participaron 47. De igual forma, sensibilizamos a 2,719 ciudadanos. Realizamos 5 capacitaciones donde participaron 94 personas. A su mismo, se realizaron 817 nuevas captaciones y se presentaron 7 averías, las cuales fueron resueltas. Finalmente, se presentaron 8 conflictos, los cuales fueron mitigados eficientemente.</p>							

Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico



Resumen fotográfico gestión social



Entrega de bombillas, SPER02



Visita a lideres, SPER02




Colocación de Caja derivadora, SPER02



Izado de poste, SPER02




Carlos Sanchez Gte. Líder de Planificación y Proyectos
Dirección de Proyectos y Gestión de Pérdidas



European
Investment
Bank






Programas y Proyectos de Rehabilitación de Redes Eléctricas – BEI
Informe de Presupuesto de los Programas y Proyectos.

Mayo 2022

Avance Económico – Programas y Proyectos BEI

Avance Económico OFID

Costo Total	USD	26,165,280.80	100.0%
Costo Total MA	USD	14,835,857.50	55.7%
Costo Total MD	USD	11,328,423.29	43.3%
Monto Ejecutado	USD	8,335,282.70	31.9%
Ejecutado MA	USD	3,250,645.55	22.0%
Ejecutado MD	USD	5,074,636.14	44.8%
Monto Restante	USD	17,829,998.10	68.1%
Restante MA	USD	11,575,210.94	75.0%
Restante MD	USD	6,253,787.15	55.2%
Monto Cubicado	USD	13,766,053.00	52.6%
Cubicado MA	USD	8,612,234.37	58.0%
Cubicado MD	USD	5,153,818.62	45.5%
Monto Disponible	USD	12,399,227.80	47.4%

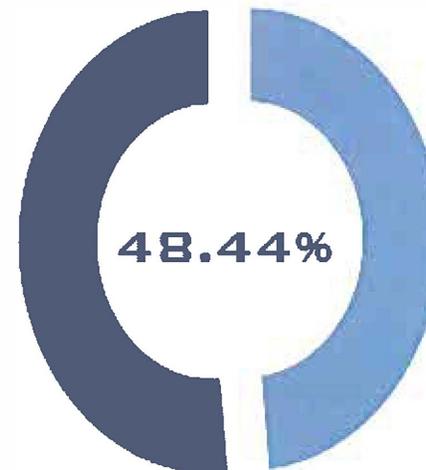


 Carlos Sanchez Gte. Líder de Planificación y Proyectos
 Dirección de Proyectos y Gestión de Pérdidas

