




Programas y Proyectos de Rehabilitación de Redes Eléctricas – BEI
Informe de Seguimiento de los Programas y Proyectos.

Noviembre 2022

Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de Redes




A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de noviembre 2022 correspondiente a la Licitación Pública Internacional No.LPI-BEI-01-2012 del Banco Europeo de Inversiones.

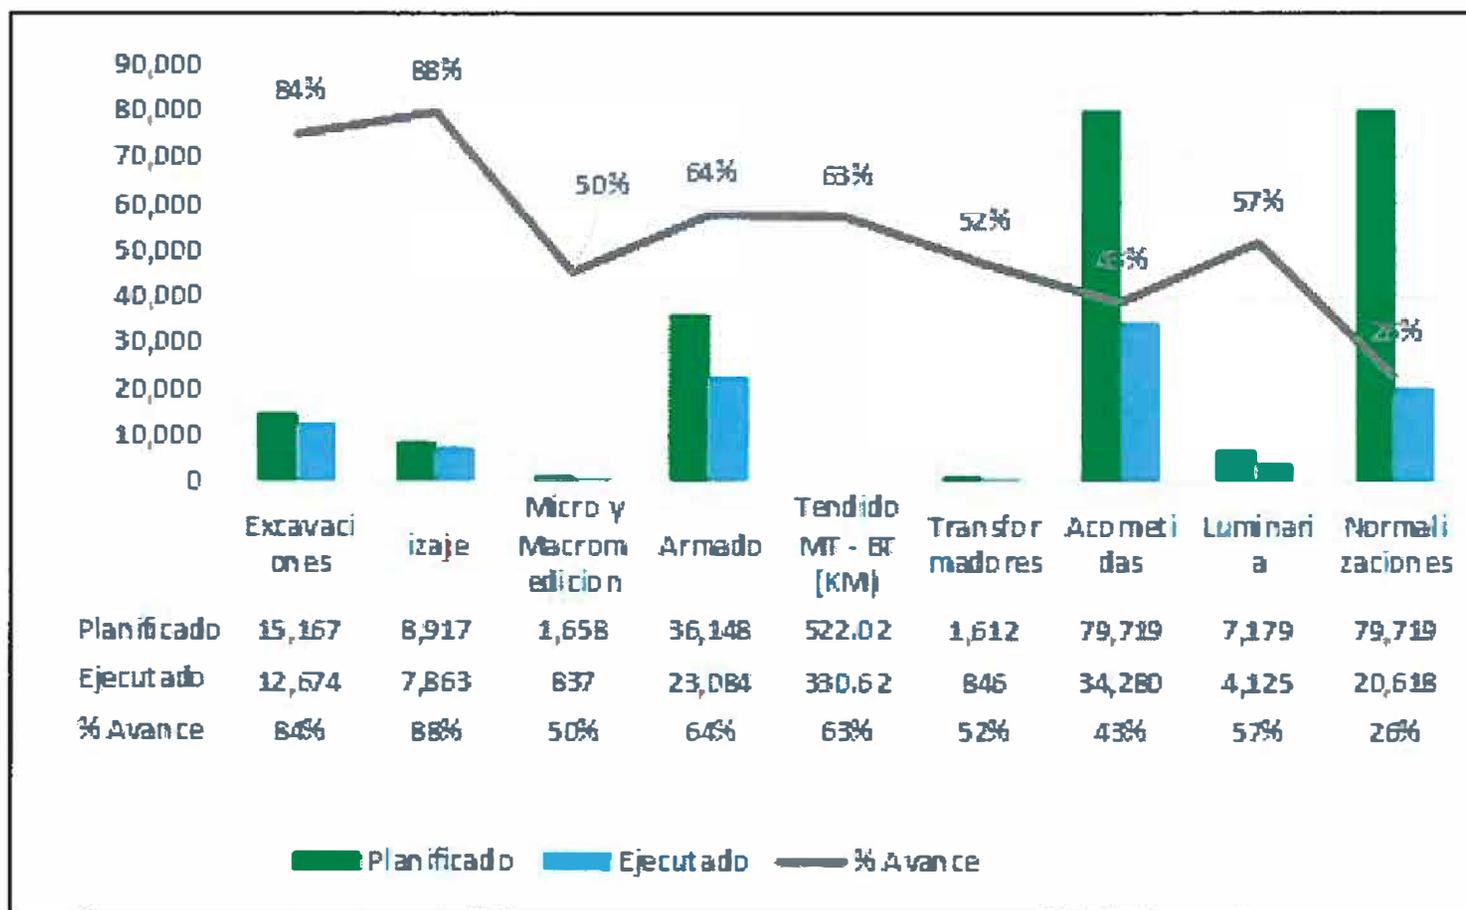


Avance del Proyecto Circuito CALE02

La siguiente grafica muestra un avance de las actividades previa para las 10,730 normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto.

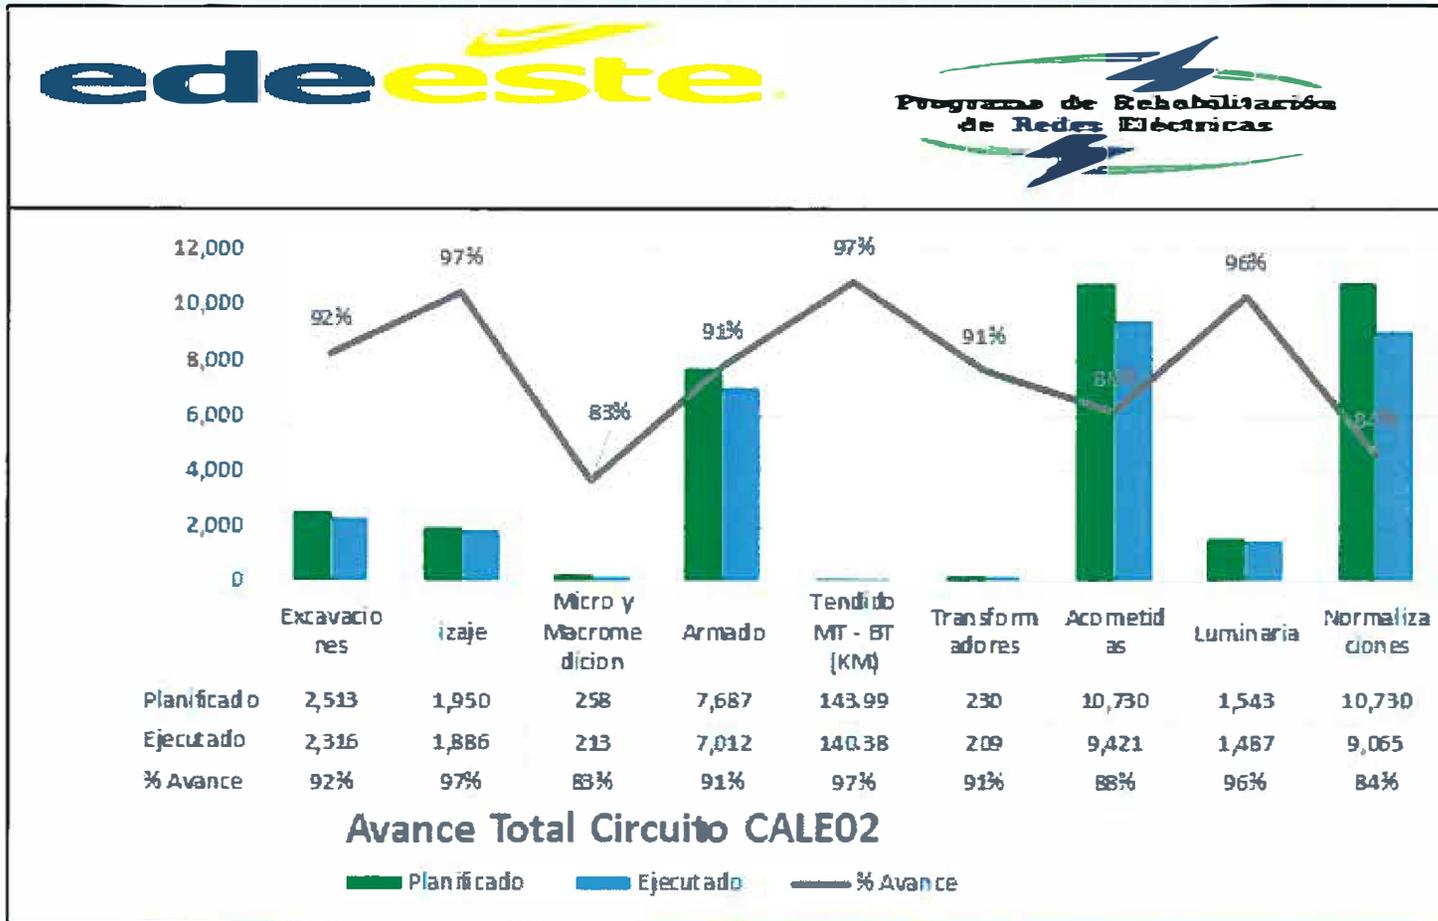

Avance del Proyecto Circuito GU6901

La siguiente grafica muestra un avance de las actividades previa para las 9,278 normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto.

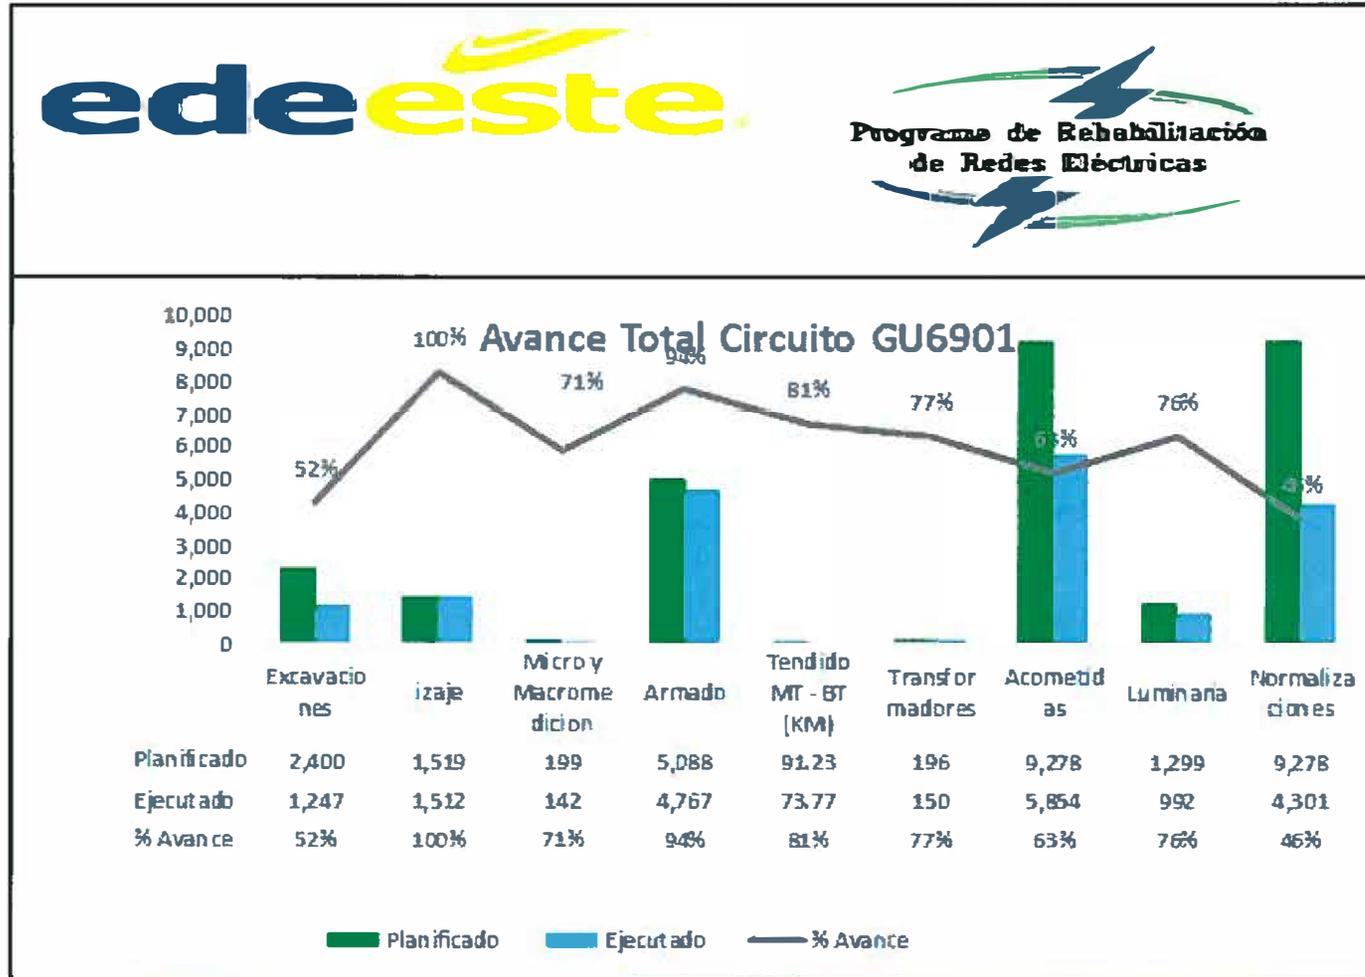


European Investment Bank




Avance del Proyecto Circuito SPER02

La siguiente grafica muestra un avance de las actividades previa para las 21,506 normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto.

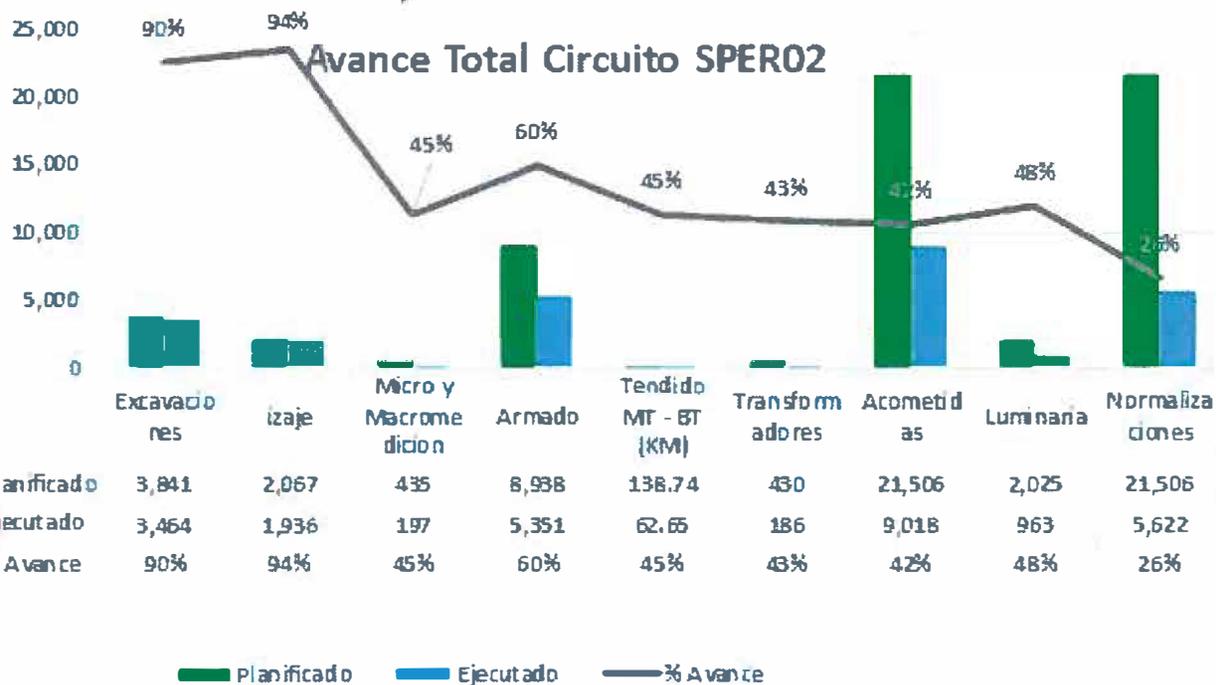

Avance del Proyecto Circuito VIME06

La siguiente grafica muestra un avance de las actividades previa para las 17,256 normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto.

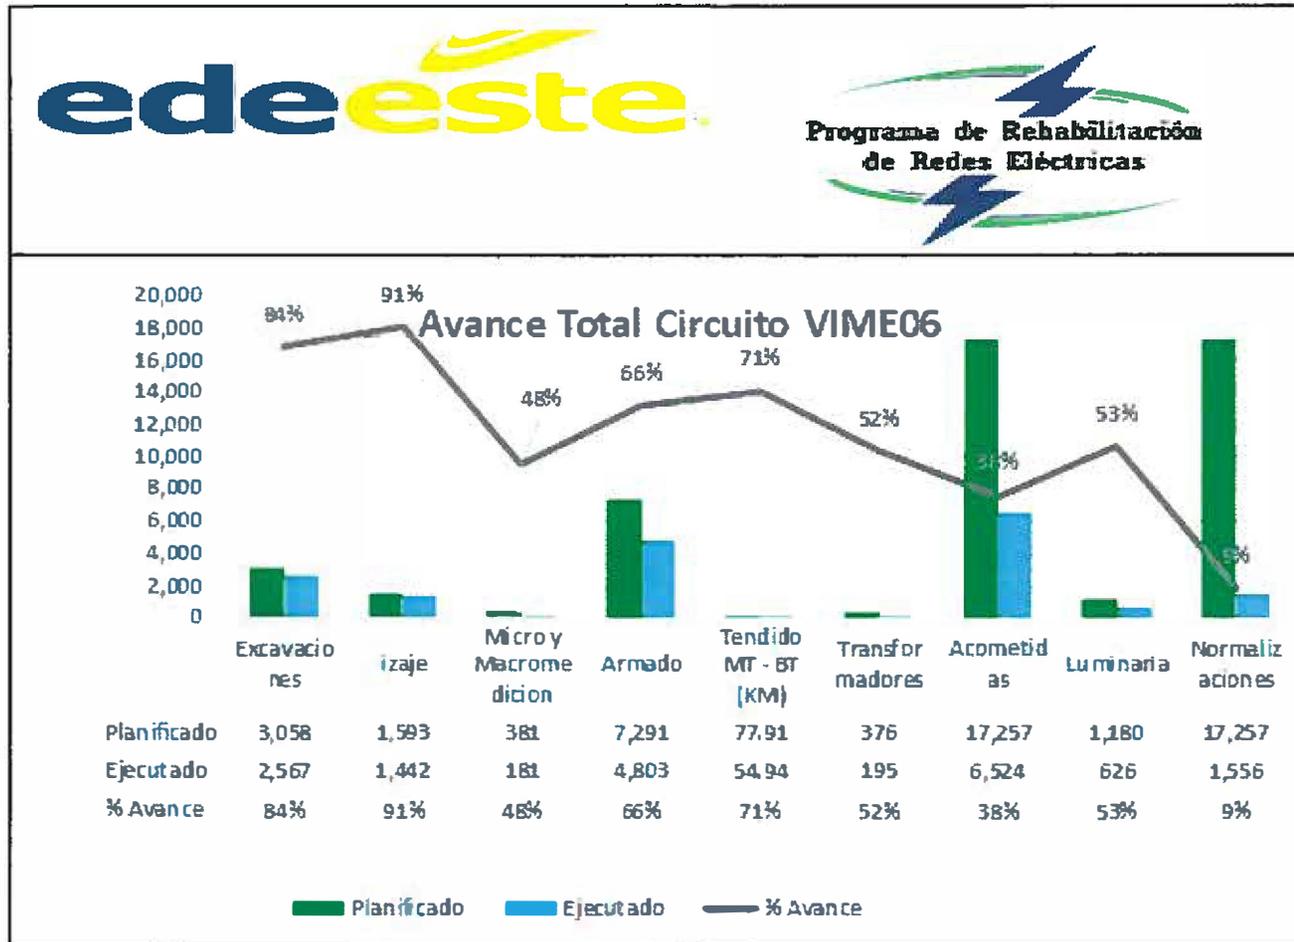


Avance del Proyecto Circuito LM6902

La siguiente grafica muestra un avance de las actividades previa para las 20,948 normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto.



edeeste

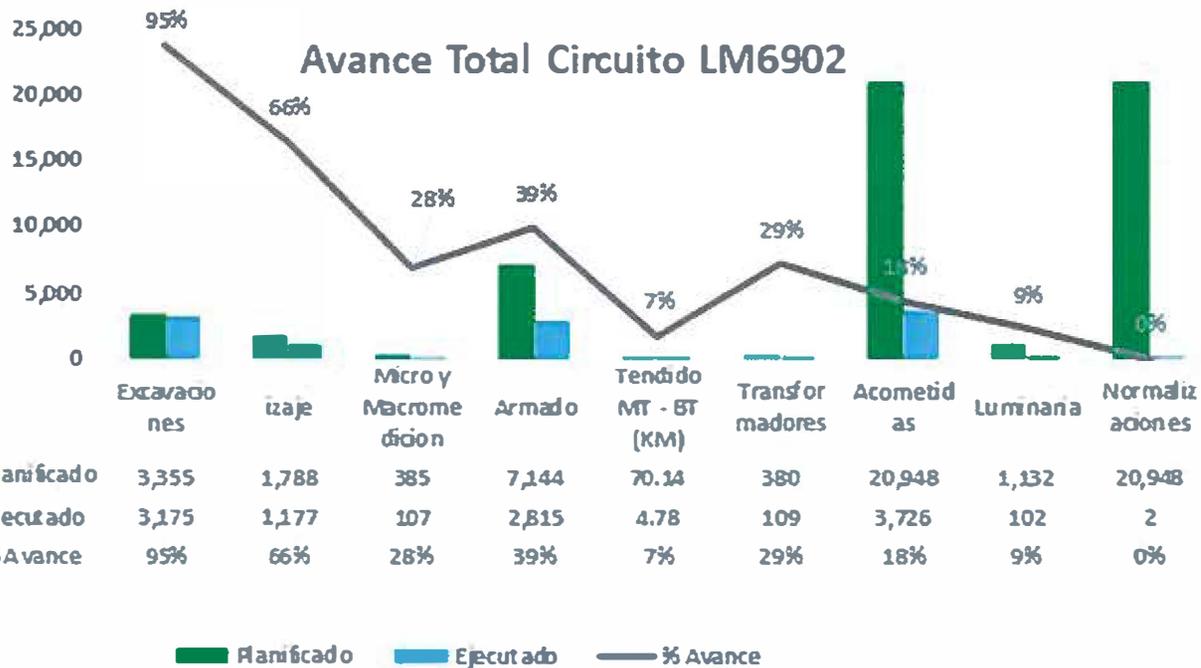

Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico

Actividades	Mes	Meta Circuito	Acumulado			Porcentaje de Avance
			Meses anteriores	Mes actual	Total	
Cantidad Personas Sensibilizadas	Noviembre	79,719	80,613	768	81,381	102%
Cantidad de personas capacitadas		30,592	19,360	6,066	25,426	83%
Cantidad adultos Capacitados		8,968	3,531	5,191	8,722	97%
Cantidad de charlas comunitarias		148	108	106	214	145%
Total de niño/as en escuelas		17,438	15,471	768	16,239	93%
Cantidad de Charlas en escuelas.		349	413	11	424	121%
Cantidad de líderes capacitados		4,185	358	107	465	11%
Cantidad de Talleres para Líderes		167	24	6	30	18%
Cantidad de COSE formados		38	39	-	39	103%
Cantidad de Líderes Incluidos en COSE		283	289	-	289	102%
Pactos Sociales		5	-	-	-	0%
Electricistas Comunitarios Formados		156	-	-	-	0%
Cantidad de Casas Redes Internas Rehabilitadas		125	-	-	-	0%
Bombillas de Bajo Consumo Distribuidas		18,750	7,750	-	7,750	41%
Otras actividades importantes realizadas durante el periodo:						
En este mes sensibilizamos a 768 personas y mediante puerta a puerta socializamos a 3,634. sostuvimos 1 reunión comunitaria con 42 ciudadanos y del mismo modo realizamos 3 reuniones con líderes con 30 personas. Así mismo sostuvimos 4 capacitaciones a líderes con 107 participantes, efectuamos 95 capacitaciones a la comunidad con 5,191 comunitarios y 15 capacitaciones a estudiantes con 1,049						

Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico



Resumen fotográfico gestión social

GU6901



SPER02



CALE02



Empresa Distribuidora de Electricidad del Este



Carlos Sánchez Gte. Lider de Planificación y Proyectos
Dirección de Proyectos y Gestión de Pérdidas





Programas y Proyectos de Rehabilitación de Redes Eléctricas – BEI
Informe de Presupuesto de los Programas y Proyectos.

Noviembre 2022


Avance Económico – Programas y Proyectos BEI



Avance Económico OFID

Costo Total	USD	26,165,280.80	100.0%
Costo Total MA	USD	14,836,857.50	56.7%
Costo Total MO	USD	11,328,423.29	43.3%
Monto Ejecutado	USD	9,760,483.19	37.3%
Ejecutado MA	USD	3,403,689.55	22.9%
Ejecutado MO	USD	6,356,793.64	56.1%
Monto Restante	USD	16,404,797.61	62.7%
Restante MA	USD	11,433,167.95	77.1%
Restante MO	USD	4,971,629.65	43.9%
Monto Cubicado	USD	18,691,351.12	71.4%
Cubicado MA	USD	12,530,592.80	64.5%
Cubicado MO	USD	6,160,758.32	54.4%
Monto Disponible	USD	7,473,929.68	28.6%

Avance Financ.
OFID

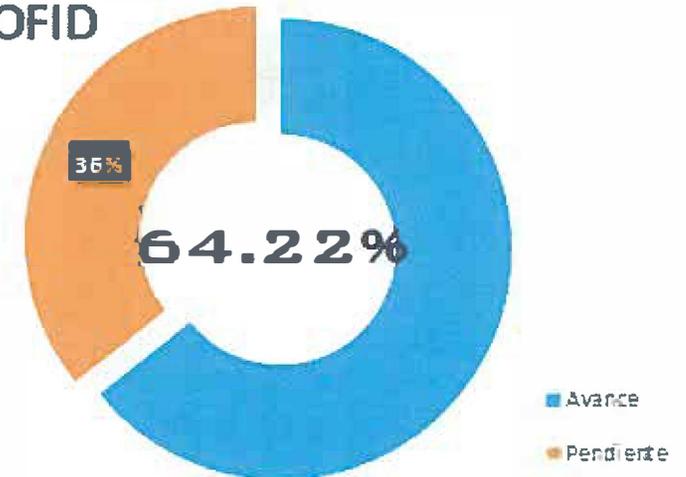

Carlos Sánchez Gte. Líder de Planificación y Proyectos
Dirección de Proyectos y Gestión de Pérdidas

